

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 030/2022 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA CENTRO**

Ubicación: **(LA CONCEPCIÓN Y LA ESCONDDIDA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

Contrato: **FISMDF 030/2022**

Tipo de Inversión: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022**

Contratista: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V.**

Programa: **S. H. VIVIENDA DIGNA**

Inicio Vigente: **miércoles, 2 de noviembre de 2022**

Días de Obra: **45 días**

Subprograma: **02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA**

Inicio Real: **miércoles, 2 de noviembre de 2022**

Monto Contratado: **\$607,575.36**


Residente: **T. C. FERNANDO LUNA MEDINA**

Fin Vigente: **viernes, 16 de diciembre de 2022**

Monto Ejercido: **\$607,575.36**

Fin Real: **viernes, 16 de diciembre de 2022**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	8.12%	10.85%	50.0%
2	14/11/2022	22.45%	24.65%	50.0%
3	21/11/2022	33.91%	35.12%	50.0%
4	28/11/2022	59.46%	61.95%	50.0%
5	05/12/2022	82.55%	83.75%	50.0%
6	12/12/2022	93.45%	95.46%	50.0%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	50.0%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

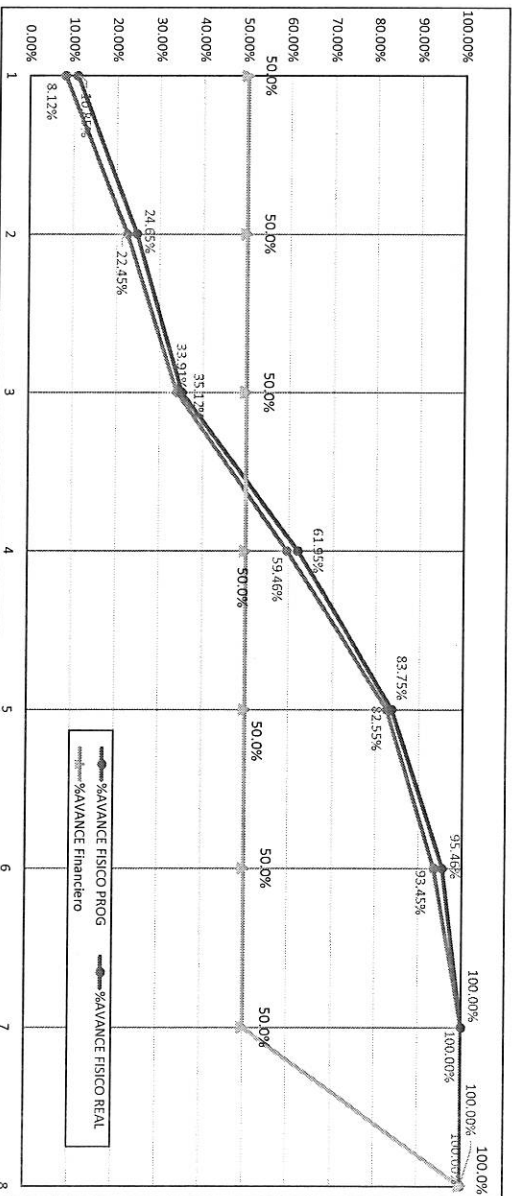

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
