

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 031/2022 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL

Ubicación: (28 DE ABRIL, FRATERNIDAD, LOS LIROS, REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DEL BARRANCO, Y SANTA BARBARA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO FISMDF 031/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 Contratista: OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA


Subprograma: 02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Inicio Vigente: miércoles, 2 de noviembre de 2022  
 Inicio Real: miércoles, 2 de noviembre de 2022  
 Fin Vigente: viernes, 16 de diciembre de 2022  
 Fin Real: viernes, 16 de diciembre de 2022

Días de Obra: 45 días  
 Monto Contratado: \$1,116,054.40  
 Monto Ejercido: \$1,116,054.40

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	10.26%	11.54%	50.0%
2	14/11/2022	21.56%	23.54%	50.0%
3	21/11/2022	31.19%	31.20%	50.0%
4	28/11/2022	58.46%	60.25%	50.0%
5	05/12/2022	80.59%	82.45%	50.0%
6	12/12/2022	91.56%	92.69%	50.0%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	50.0%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

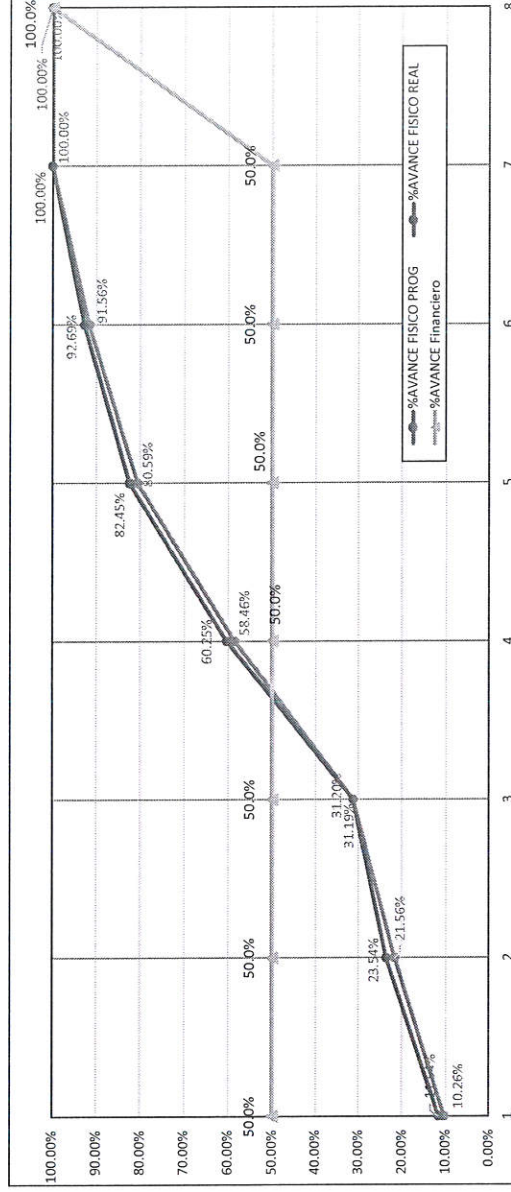

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
