

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 032/2022 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR

Ubicación: (CHICALÓTE, GUAYANA; MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 Contrato: FISMDF 032/2022  
 Contratista: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.  
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022  
 Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA  
 Subprograma: 02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA  
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Días de Obra: 45 días  
 Monto Contratado: \$1,614,578.50  
 Monto Ejercido: \$1,614,578.50

Inicio Vigente: miércoles, 2 de noviembre de 2022  
 Inicio Real: miércoles, 2 de noviembre de 2022  
 Fin Vigente: viernes, 16 de diciembre de 2022  
 Fin Real: viernes, 16 de diciembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	11.56%	12.36%	50.0%
2	14/11/2022	22.56%	24.85%	50.0%
3	21/11/2022	32.36%	33.56%	50.0%
4	28/11/2022	57.69%	59.56%	50.0%
5	05/12/2022	81.36%	83.74%	50.0%
6	12/12/2022	93.56%	95.64%	50.0%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	50.0%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

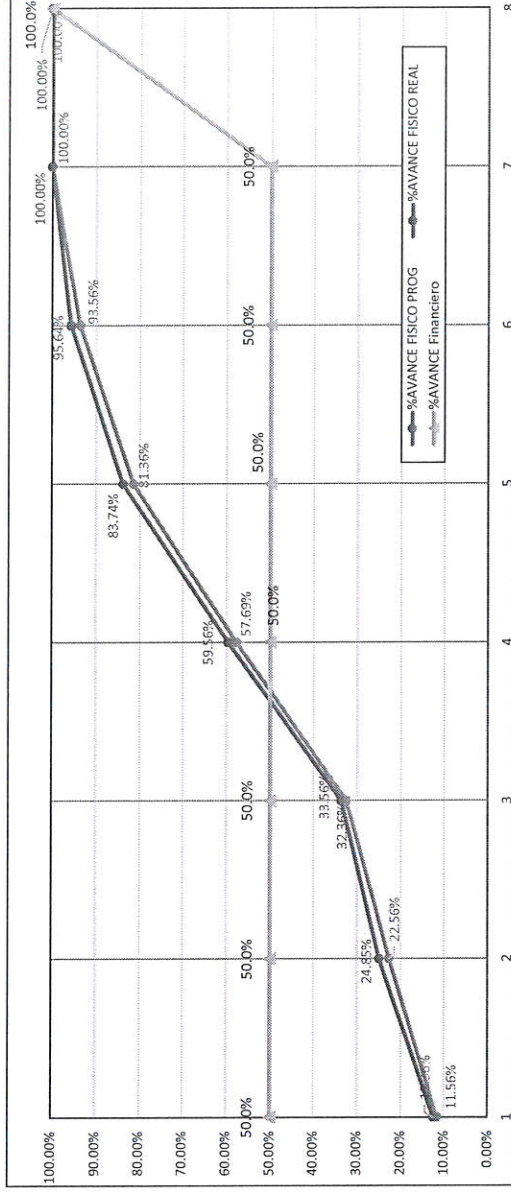

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
