

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 0337/2022 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA NORTE-CENTRO-CABECERA

Ubicación: (COL. 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, LA CONCEPCIÓN, LA ESCONDIDA, RANCHO NUEVO, TEPETATE, FRACC. CARDONAL, FRACC. CEDROS, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. PANAMERICANO, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. REVOLUCIÓN, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BÁRBARA, FRACC. URBIVILLA DEL VERGEL) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA


Subprograma: EQUIPAMIENTO

Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS

Inicio Vigente: viernes, 4 de noviembre de 2022
 Inicio Real: viernes, 4 de noviembre de 2022
 Fin Vigente: domingo, 18 de diciembre de 2022
 Fin Real: domingo, 18 de diciembre de 2022

Días de Obra: 45 días
 Monto Contratado: \$943,112.25
 Monto Ejercido: \$943,112.25

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	15.23%	16.58%	50.0%
2	14/11/2022	25.56%	27.59%	50.0%
3	21/11/2022	33.45%	36.56%	50.0%
4	28/11/2022	46.15%	60.53%	65.7%
5	05/12/2022	70.59%	72.89%	65.7%
6	12/12/2022	92.65%	95.36%	76.1%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	76.1%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

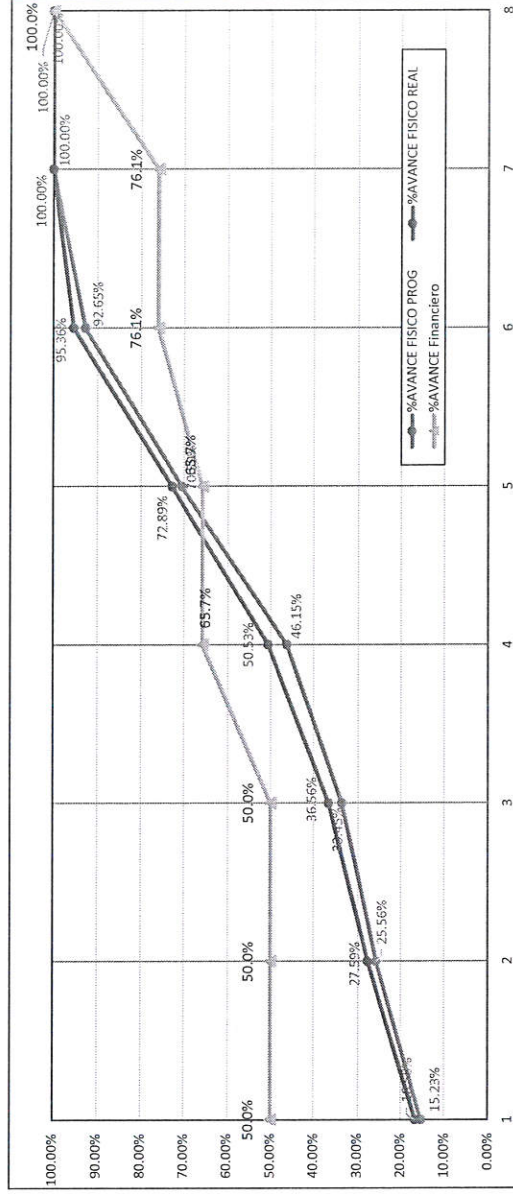

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Ángel C.
