

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 034/2022 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA SUR

Ubicación: (CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETO, MACARIO J. GÓMEZ, PUERTECITO DE LA VIRGEN, VIÑEDOS RIBIER, FRACC. EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. LA CASITA, FRACC. LA RIBERA, FRACC. VILLAS DE SAN FELIPE II) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO FISMDF 034/2022 Contrato:

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 Contratista: COMERCIALIZADORA ECOTEMPER, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA Inicio Vigente: viernes, 4 de noviembre de 2022 Días de Obra: 45 días
 Subprograma: EQUIPAMIENTO Inicio Real: viernes, 4 de noviembre de 2022 Monto Contratado: \$876,941.21
 Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS Fin Vigente: domingo, 18 de diciembre de 2022 Monto Ejercido: \$876,941.21
 Fin Real: domingo, 18 de diciembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	8.32%	9.63%	50.0%
2	14/11/2022	21.56%	23.56%	50.0%
3	21/11/2022	32.23%	35.46%	50.0%
4	28/11/2022	56.74%	60.85%	66.1%
5	05/12/2022	66.12%	70.56%	66.1%
6	12/12/2022	80.23%	83.56%	83.1%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	83.1%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

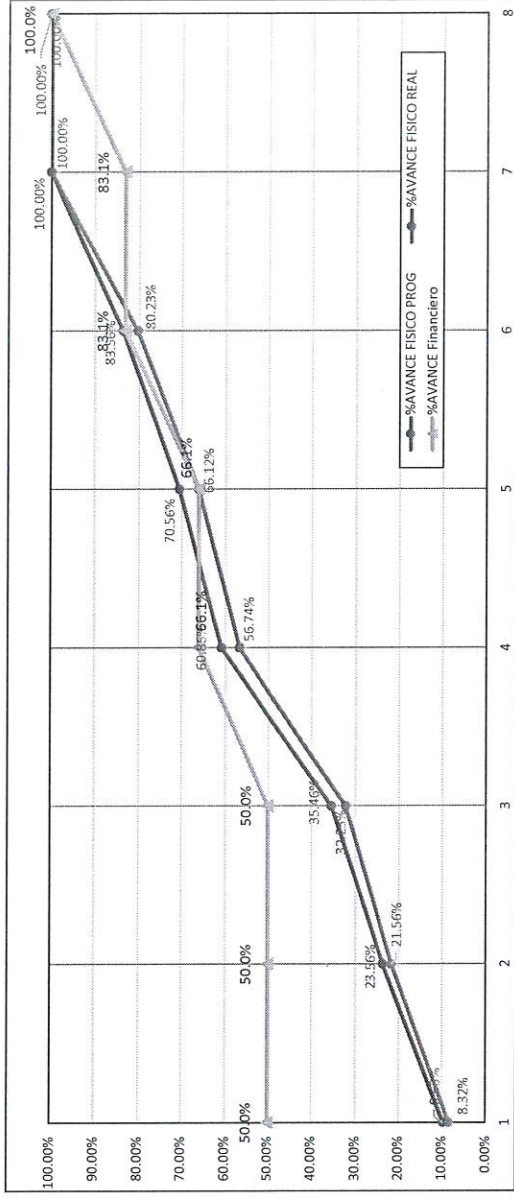

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Ángel C.
