

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 037/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ
 FISMDF 038/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: AMAPOLAS DEL RÍO
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
 Contratista: C. Jorge Armando Quezada Sotelo

Contrato: FISMDF 037-038/2022

Programa: SD ALCANTARILLADO

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Inicio Vigente: jueves, 15 de diciembre de 2022

Inicio Real: jueves, 15 de diciembre de 2022

Fin Vigente: miércoles, 21 de diciembre de 2022


Fin Real: miércoles, 21 de diciembre de 2022

Días de Obra: 7 días

Monto Contratado: \$144,939.85

Monto Ejercido: \$144,939.85

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/12/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	22/12/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	29/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

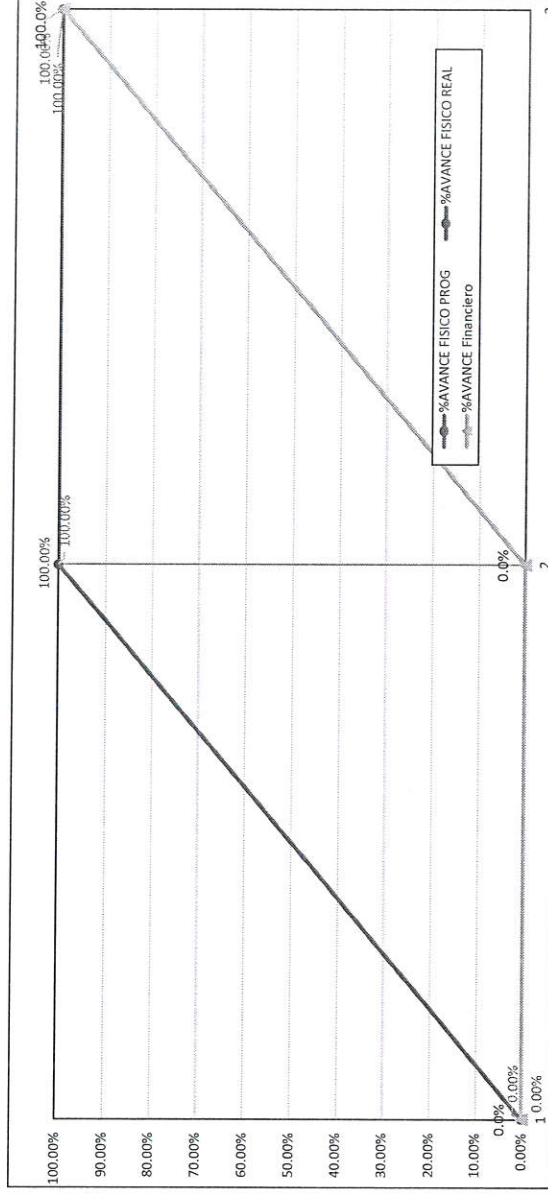

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten Signature]
