

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 001/22 READECUACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2022

Programa: DA EDIFICIOS PUBLICOS

Subprograma: 01 REHABILITACION

Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FR 001/2022

Contratista: C. I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez


Inicio Vigente: lunes, 30 de mayo de 2022 Días de Obra: 60 días

Inicio Real: lunes, 30 de mayo de 2022 Monto Contratado: \$ 1,130,893.77

Fin Vigente: jueves, 28 de julio de 2022 Monto Ejercido: \$ 1,130,893.77

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/05/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	13/06/2022	12.24%	13.40%	53.4%
3	27/06/2022	46.34%	47.30%	55.4%
4	11/07/2022	76.87%	77.80%	58.2%
5	25/07/2022	98.75%	99.12%	58.2%
6	08/08/2022	100.00%	100.00%	64.3%
7	22/08/2022	100.00%	100.00%	94.1%
8	05/09/2022	100.00%	100.00%	100.0%

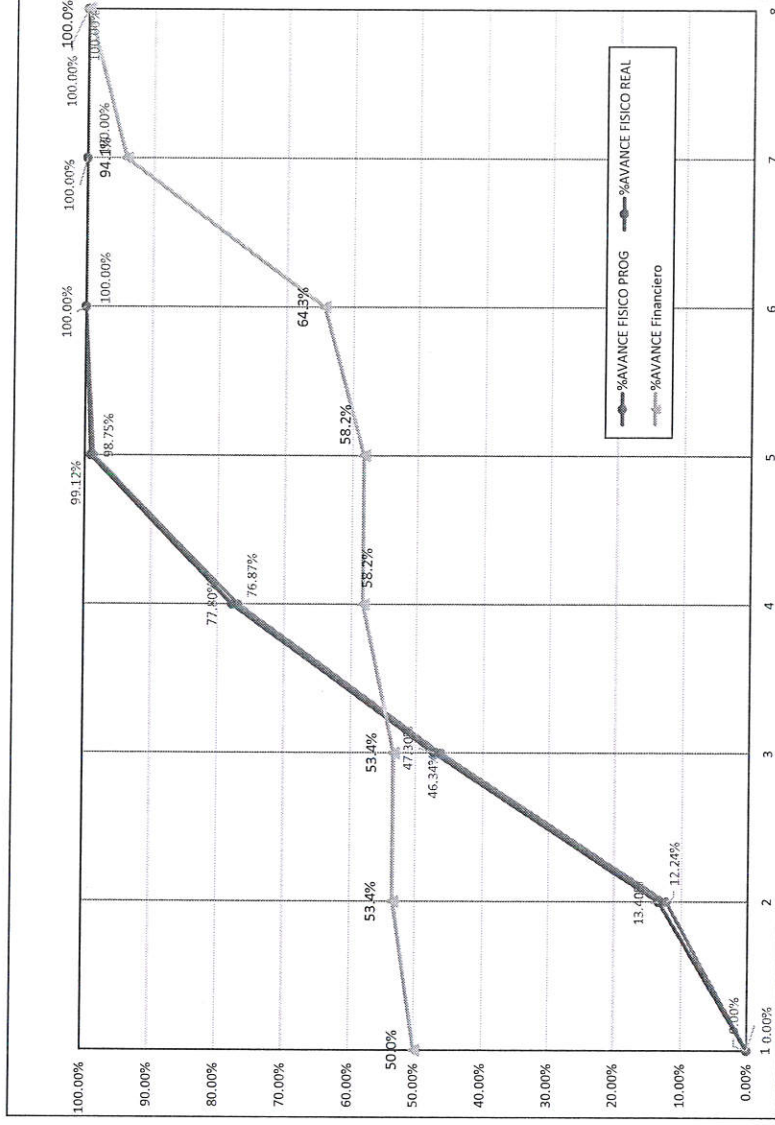

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
