

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL DIF, CABECERA MUNICIPAL, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PRUEBA DE PENETR CABECERA MUNICIPAL
 Ubicación: IP 001 A/2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2022

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.

Inicio Vigente: sábado, 8 de enero de 2022

Inicio Recl: sábado, 8 de enero de 2022

Fin Vigente: miércoles, 12 de enero de 2022


Fin Recl: miércoles, 12 de enero de 2022

Días de Obra: 5

Monto Contratado: \$46,110.00

Monto Ejercido: \$46,110.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/01/2022	75.00%	75.00%	0.0%
2	17/01/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	31/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%

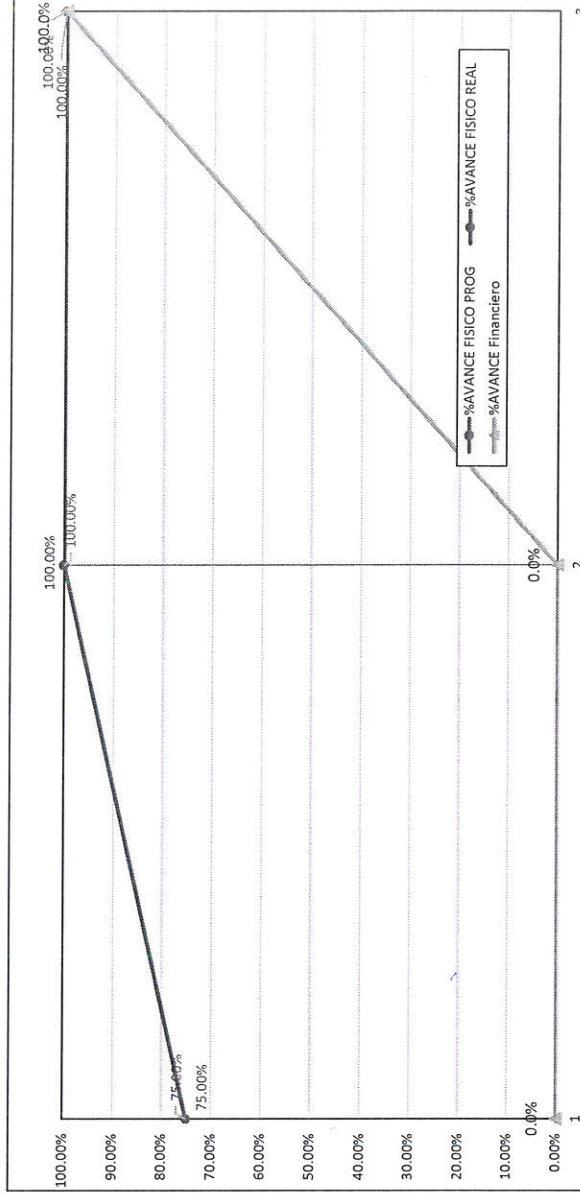

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
