

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ARBULO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PR PUERTECITO DE LA VIRGEN

Ubicación:

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2022

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE RL. DE C.V.

Inicio Vigente: jueves, 24 de febrero de 2022

Fin Vigente: lunes, 28 de febrero de 2022


Fin Real: lunes, 28 de febrero de 2022

Días de Obra: 5

Monto Contratado: \$46,110.00

Monto Ejercido: \$46,110.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/02/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	28/02/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	14/03/2022	100.00%	100.00%	100.0%

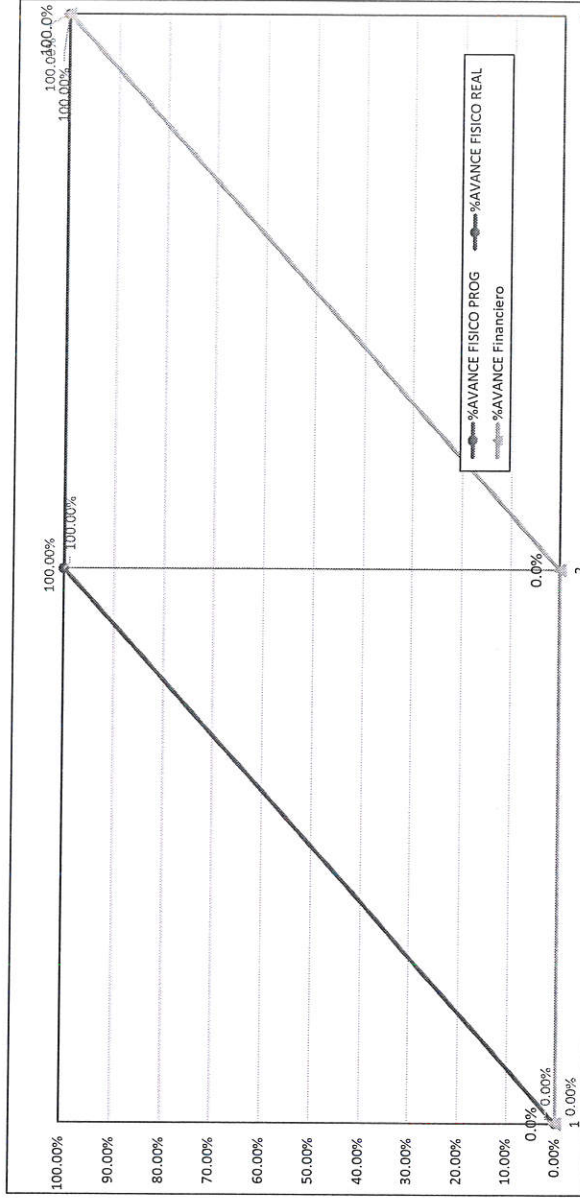

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten Signature]
