

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 002/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FINAL DE LA PARCELA LADO SUR


Ubicación: LA GUAYANA
 Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019
 Programa: SD ALCANTARILLADO
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: PFR 002/2022
 Contratista: TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO.
 Inicio Vigente: sábado, 20 de agosto de 2022
 Días de Obra: 30

Inicio Real: sábado, 20 de agosto de 2022
 Fin Vigente: domingo, 18 de septiembre de 2022
 Fin Real: domingo, 18 de septiembre de 2022

Monto Contratado: \$ 280,000.00
 Monto Ejercido: \$ 280,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/08/2022	2.54%	3.65%	0.00%
2	29/08/2022	15.20%	17.12%	0.00%
3	05/09/2022	65.86%	68.53%	0.00%
4	12/09/2022	72.15%	73.46%	0.00%
5	19/09/2022	100.00%	100.00%	0.00%
6	26/09/2022	100.00%	100.00%	0.00%
7	03/10/2022	100.00%	100.00%	0.00%
8	10/10/2022	100.00%	100.00%	0.00%
9	17/10/2022	100.00%	100.00%	0.00%
10	24/10/2022	100.00%	100.00%	0.00%
11	31/10/2022	100.00%	100.00%	0.00%
12	07/11/2022	100.00%	100.00%	0.00%
13	14/11/2022	100.00%	100.00%	0.00%
14	21/11/2022	100.00%	100.00%	0.00%
15	28/11/2022	100.00%	100.00%	37.17%
16	05/12/2022	100.00%	100.00%	37.17%
17	12/12/2022	100.00%	100.00%	37.17%
18	19/12/2022	100.00%	100.00%	100.00%

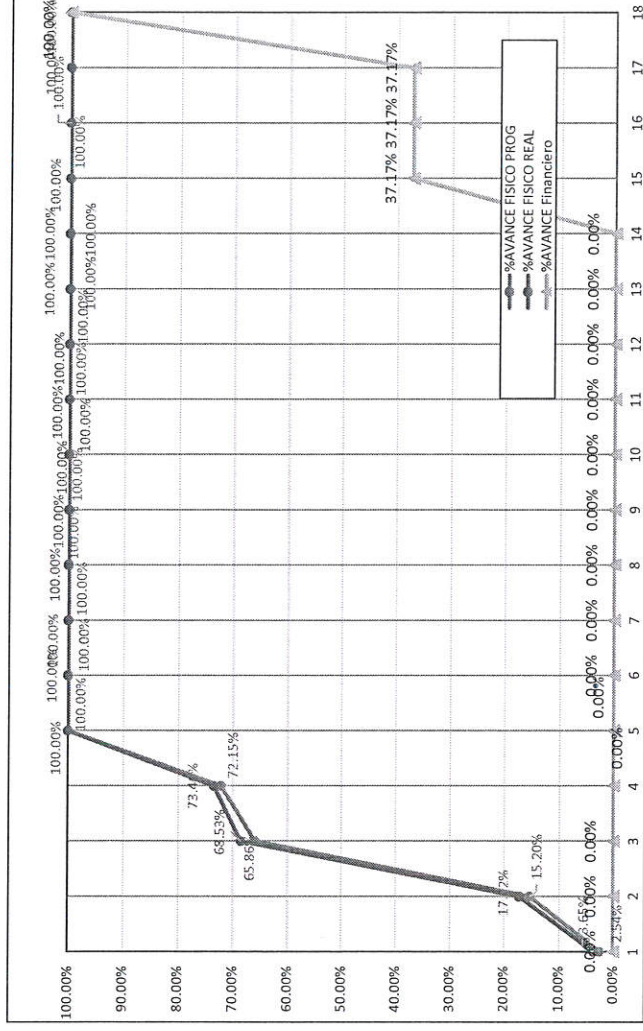

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
