

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 003/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS

Ubicación: COLÓNIA MACARIO J. GOMEZ

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2021

Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

Subprograma: 01 CONCRETO

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: PFR 003/2022

Contratista: CORACO, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 2 de noviembre de 2022

45

Inicio Real: miércoles, 2 de noviembre de 2022


Monto Contratado: \$ 550,000.00

Fin Vigente: viernes, 16 de diciembre de 2022

Monto Ejercido: \$ 550,000.00

Fin Real: viernes, 16 de diciembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	0.99%	1.12%	50.00%
2	14/11/2022	2.59%	3.59%	50.00%
3	21/11/2022	24.50%	26.45%	50.00%
4	28/11/2022	49.60%	52.69%	50.00%
5	05/12/2022	73.99%	75.98%	72.29%
6	12/12/2022	97.59%	97.99%	93.25%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	93.25%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.00%

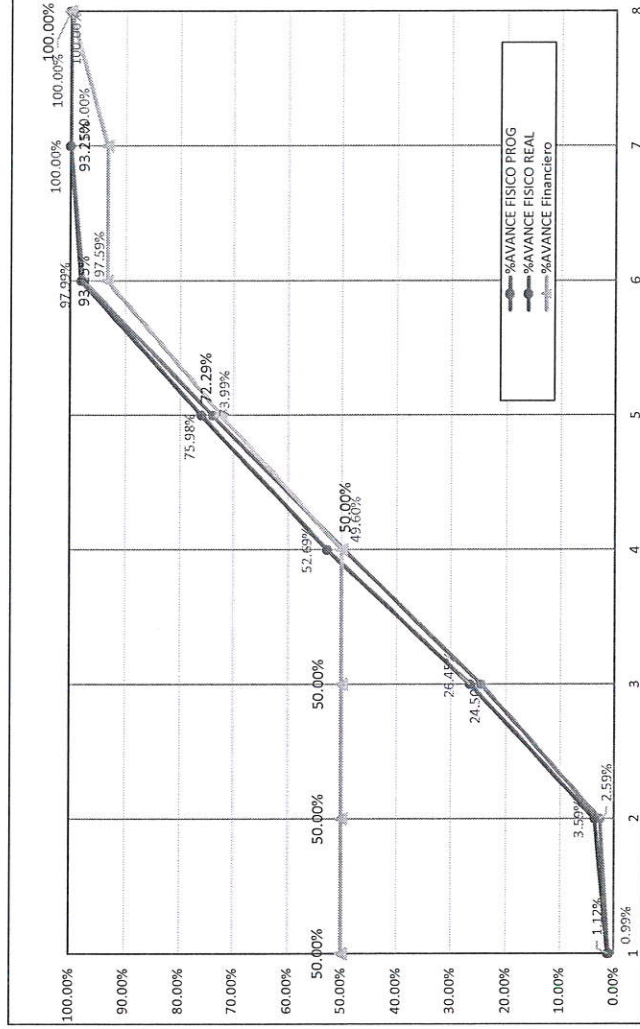

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
