


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001 A/2023 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DE MODULO DE BAÑOS, EN EL AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR, AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., CON UN SONDEO TIPO SPT A 6 mts DE PROFUNDIDAD EJECUTADO CON PERFORADORA ROTARIA REALIZANDO PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR A CADA METRO Y REQUIERENDO				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IP 001 A/2023		
Tipo de inversión:	IP INGRESOS PROPIOS 2023	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	jueves, 19 de enero de 2023	Días de Obra:	15
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	jueves, 19 de enero de 2023	Monto Contratado:	\$23,316.00
Residente:	ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA	Fin Vigente:	jueves, 2 de febrero de 2023	Monto Ejercido:	\$23,316.00
		Fin Real:	jueves, 2 de febrero de 2023		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/01/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	25/01/2023	53.00%	53.00%	0.0%
3	01/02/2023	63.00%	63.00%	0.0%
4	02/02/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	08/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	15/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%

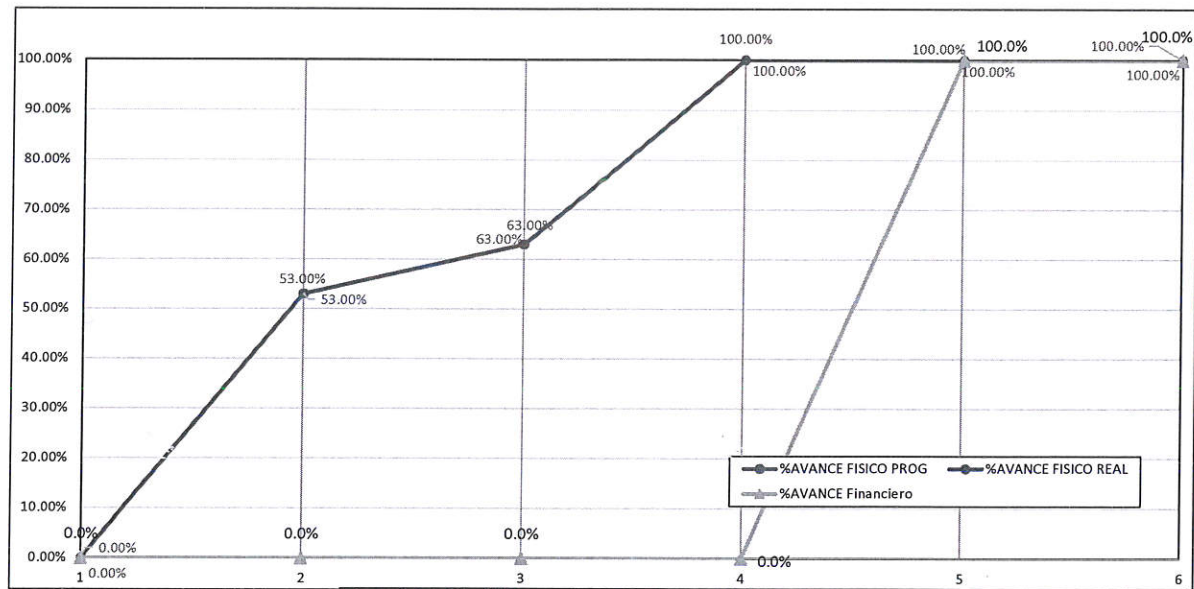

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
