


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 001 /2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI

Ubicación: FRACCIONAMIENTO LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2023
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIV
Subprograma: 02 A CONSTRUCCIÓN-PREESCOLAR
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: FR 001 /2023
Contratista: C. Edgar Joel Tapia Guzmán
Inicio Vigente: viernes, 5 de mayo de 2023 **Días de Obra:** 60
Inicio Real: viernes, 5 de mayo de 2023 **Monto Contratado:** \$854,254.26
Fin Vigente: lunes, 3 de julio de 2023 **Monto Ejercido:** \$854,254.26
Fin Real: lunes, 3 de julio de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	15/05/2023	5.00%	5.12%	0.0%
3	30/05/2023	43.00%	43.20%	57.2%
4	15/06/2023	76.63%	76.65%	68.6%
5	30/06/2023	99.86%	99.87%	91.1%
6	15/07/2023	100.00%		
7	30/07/2023	100.00%		
8	14/08/2023	100.00%		
9	29/08/2023	100.00%		

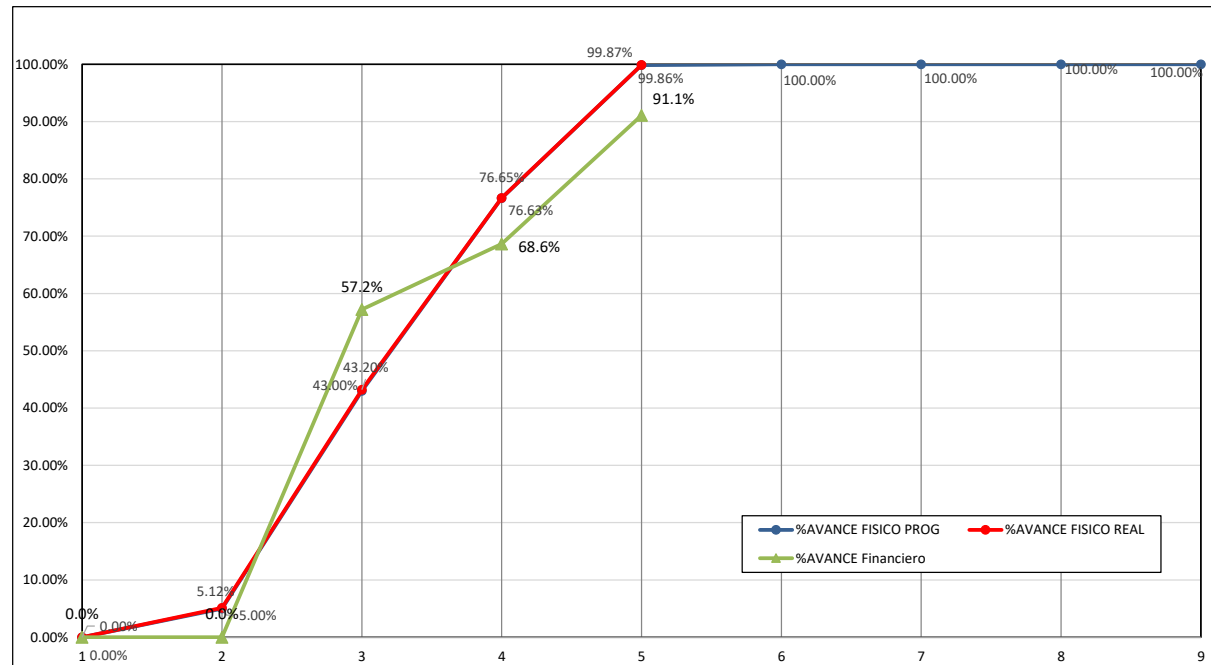

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
