

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001 /2023 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN GALERIAS, COMPLEJO J. GUADALUPE POSADA, Y REHABILITACIÓN DE ARMERÍAS EN SUBCOMANDANCIA DEL FRACC. LA RIBERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ubicación:** CABECERA Y FRACC. LA RIBERA

**Contrato:** PF 001 /2023

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

**Contratista:** C. Sergio Moreno Gutiérrez

**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Inicio Vigente:** viernes, 5 de mayo de 2023      **Días de Obra:** 90

**Subprograma:** 03,01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN


**Inicio Real:** viernes, 5 de mayo de 2023      **Monto Contratado:** \$1,702,194.18

**Residente:** ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

**Fin Vigente:** miércoles, 2 de agosto de 2023      **Monto Ejercido:** \$1,702,194.18

**Fin Real:** miércoles, 2 de agosto de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	15/05/2023	3.30%	3.33%	0.0%
3	30/05/2023	25.53%	25.55%	59.9%
4	15/06/2023	45.97%	45.98%	68.2%
5	30/06/2023	60.85%	60.88%	68.2%
6	15/07/2023	71.69%		
7	30/07/2023	95.29%		
8	14/08/2023	100.00%		
9	29/08/2023	100.00%		

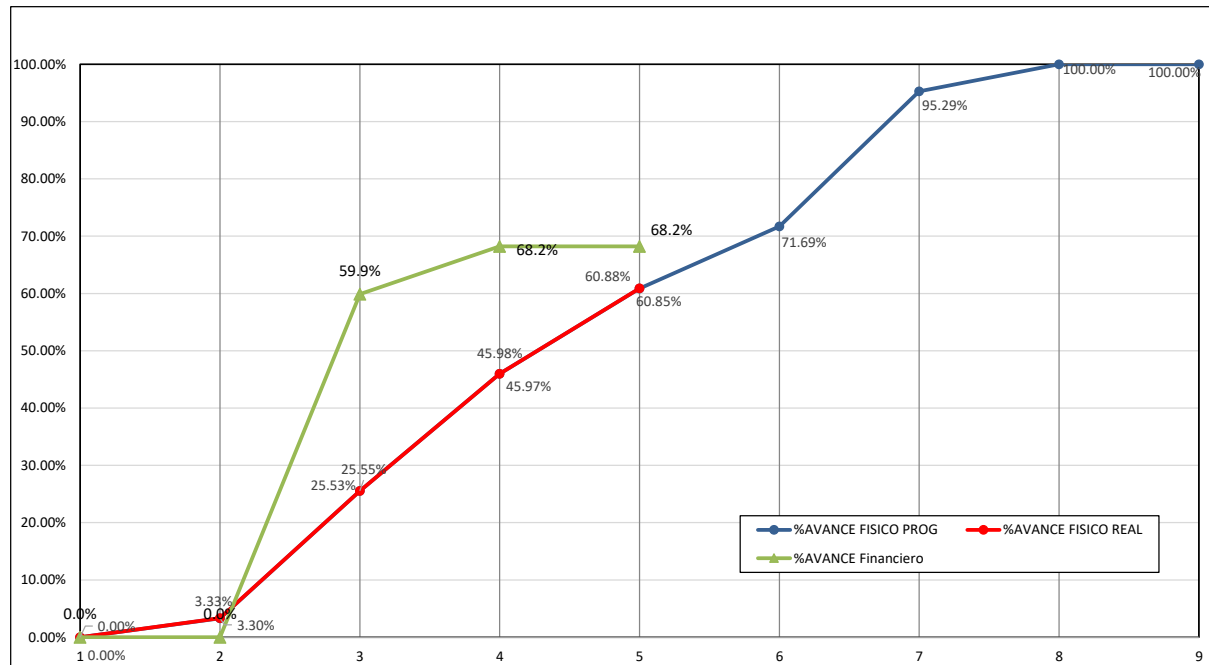

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
