


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMILLO TRAMO DE CALLE FCO. PONCE - SABINO, (1ERA ETAPA).

<b>Ubicación:</b> COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022	<b>Contrato:</b> PFR 001/2022	
<b>Tipo de inversión:</b> SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN	<b>Contratista:</b> C. ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO	
<b>Programa:</b> 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	<b>Inicio Vigente:</b> viernes, 5 de mayo de 2023	<b>Días de Obra:</b> 60
<b>Subprograma:</b> 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	<b>Inicio Real:</b> viernes, 5 de mayo de 2023	<b>Monto Contratado:</b> \$ 1,446,433.73
<b>Residente:</b> URB. SERGIO MARQUEZ LEON	<b>Fin Vigente:</b> lunes, 3 de julio de 2023	<b>Monto Ejercido:</b> \$ 1,446,433.73
	<b>Fin Real:</b> lunes, 3 de julio de 2023	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	15/05/2023	2.62%	2.64%	0.0%
3	30/05/2023	30.32%	30.35%	0.0%
4	15/06/2023	46.91%	46.92%	59.8%
5	30/06/2023	96.60%	96.62%	86.9%
6	15/07/2023	100.00%		
7	30/07/2023	100.00%		
8	14/08/2023	100.00%		
9	29/08/2023	100.00%		

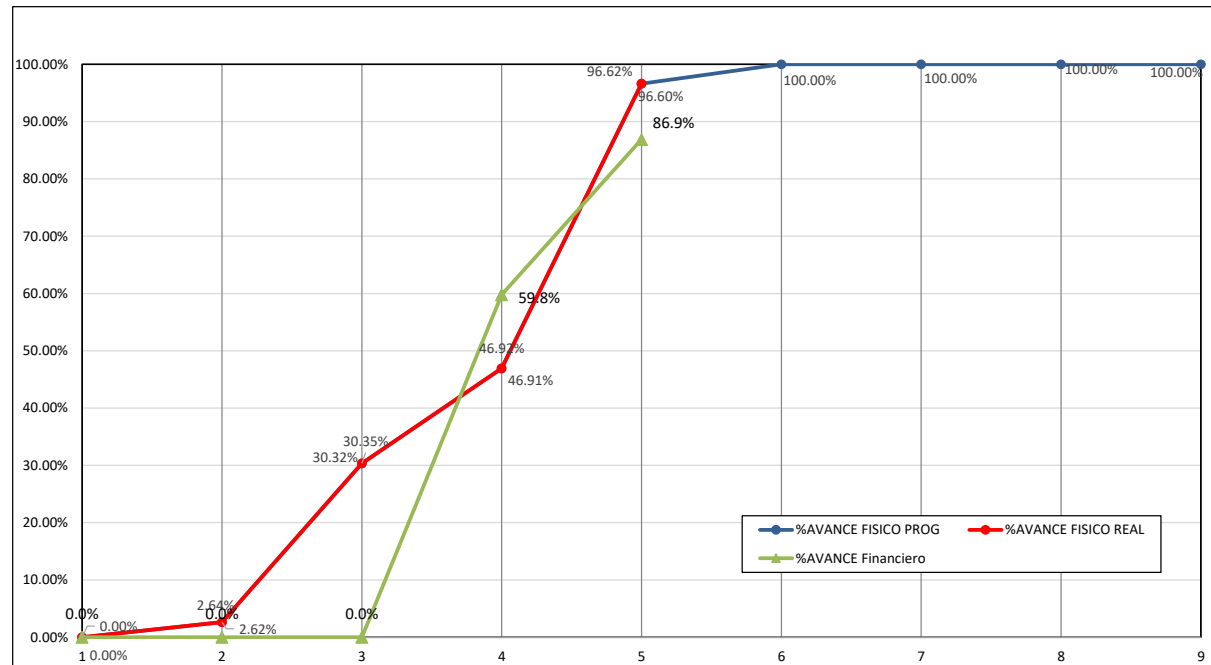

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
