


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 A/2023 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DE MODULO DE BAÑOS, EN EL AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR, AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., CON UN SONDEO TIPO SPT A 5 mts DE PROFUNDIDAD EJECUTADO CON PERFORADORA ROTARIA, REALIZANDO PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR A CADA METRO Y RECUPERANDO
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP 001 A/2023
Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023 **Contratista:** INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** jueves, 19 de enero de 2023 **Días de Obra:** 15
Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** jueves, 19 de enero de 2023 **Monto Contratado:** \$23,316.00
Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 2 de febrero de 2023 **Monto Ejercido:** \$23,316.00
Fin Real: jueves, 2 de febrero de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/01/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	25/01/2023	53.00%	53.00%	0.0%
3	01/02/2023	63.00%	63.00%	0.0%
4	02/02/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	08/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	15/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%

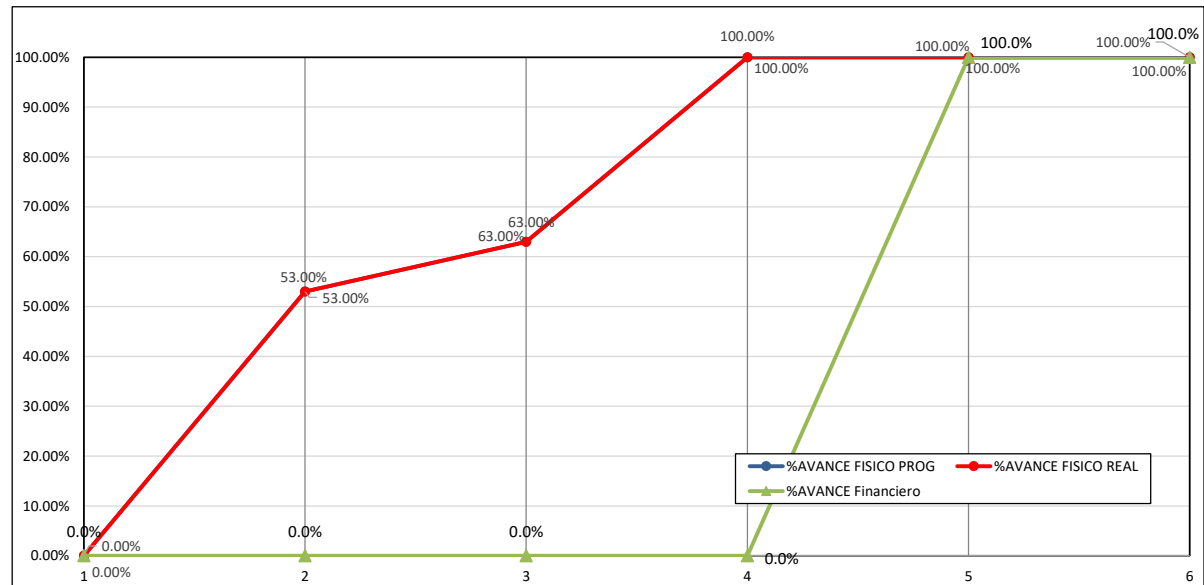

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
