

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 B/2023 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESPLANTE DE EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN LA ESCONDIDA, EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 B/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: jueves, 19 de enero de 2023

Días de Obra: 15

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: jueves, 19 de enero de 2023

Monto Contratado: \$39,614.00


Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: jueves, 2 de febrero de 2023

Monto Ejercido: \$39,614.00

Fin Real: jueves, 2 de febrero de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/01/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	25/01/2023	59.00%	59.00%	0.0%
3	01/02/2023	70.00%	70.00%	0.0%
4	02/02/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	08/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	15/02/2023	100.00%	100.00%	100.0%

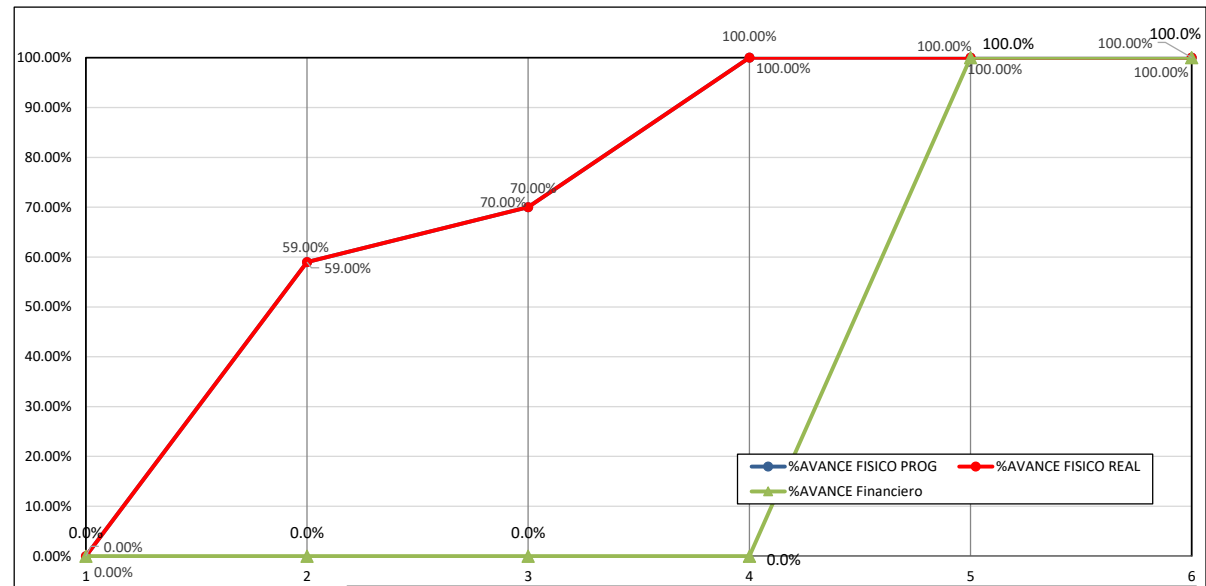

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
