


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	IP 001 C/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 5 OBRAS Y 2 PROYECTOS ESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	IP 001 C/2023		
<b>Tipo de inversión:</b>	IP INGRESOS PROPIOS 2023	<b>Contratista:</b>	ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	viernes, 31 de marzo de 2023	<b>Días de Obra:</b>	270
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	viernes, 31 de marzo de 2023	<b>Monto Contratado:</b>	\$137,069.08
<b>Residente:</b>	ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS	<b>Fin Vigente:</b>	lunes, 25 de diciembre de 2023	<b>Monto Ejercido:</b>	\$137,069.08
		<b>Fin Real:</b>	lunes, 25 de diciembre de 2023		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/04/2023	24.74%	35.97%	0.0%
2	30/04/2023	26.28%	35.97%	0.0%
3	15/05/2023	28.71%	48.87%	0.0%
4	30/05/2023	31.15%	55.60%	0.0%
5	15/06/2023	38.95%	71.38%	0.0%
6	30/06/2023	41.39%	71.38%	0.0%
7	15/07/2023	43.82%		
8	30/07/2023	44.72%		
9	15/08/2023	67.49%		
10	30/08/2023	69.73%		
11	15/09/2023	73.29%		
12	30/09/2023	76.84%		
13	15/10/2023	85.98%		
14	30/10/2023	88.23%		
15	15/11/2023	88.23%		
16	30/11/2023	91.78%		
17	15/12/2023	94.02%		
18	30/12/2023	100.00%		
19	15/01/2024	100.00%		
20	30/01/2024	100.00%		

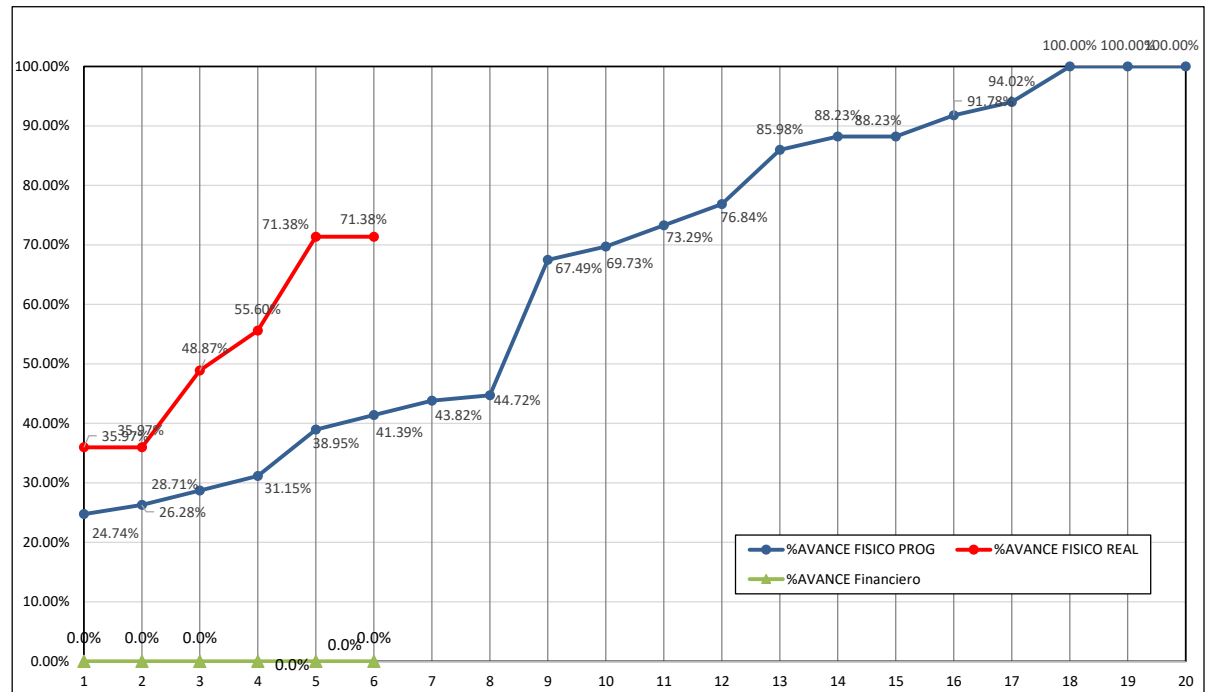

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
