

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 D/2023 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO DE LA CALLE CIRCUITO ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DENOMINADA LA CONCEPCION (22°02'03.7"N;102°17'52.1"W) Y DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALAMILLOS EN LA COLONIA MACARIO J. GOMEZ (21°58'41.5" N;102°14'47.4"W), DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., CON DOS SONDEOS TIPO PCA A 1.5 M DE PROFUNDIDAD EXCAVADOS CON EQUIPO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP 001 D/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023 **Contratista:** Ing. Luis Gerardo del Muro Caldera


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** viernes, 21 de abril de 2023 **Días de Obra:** 8 **270**

Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** viernes, 21 de abril de 2023 **Monto Contratado:** \$46,541.78 \$137,069.08

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** viernes, 28 de abril de 2023 **Monto Ejercido:** \$46,541.78 \$137,069.08

Fin Real: viernes, 28 de abril de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/04/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2023	100.00%	100.00%	0.0%
3	21/05/2023	100.00%	100.00%	100.0%
4	05/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
5	20/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	05/07/2023	100.00%	100.00%	100.0%

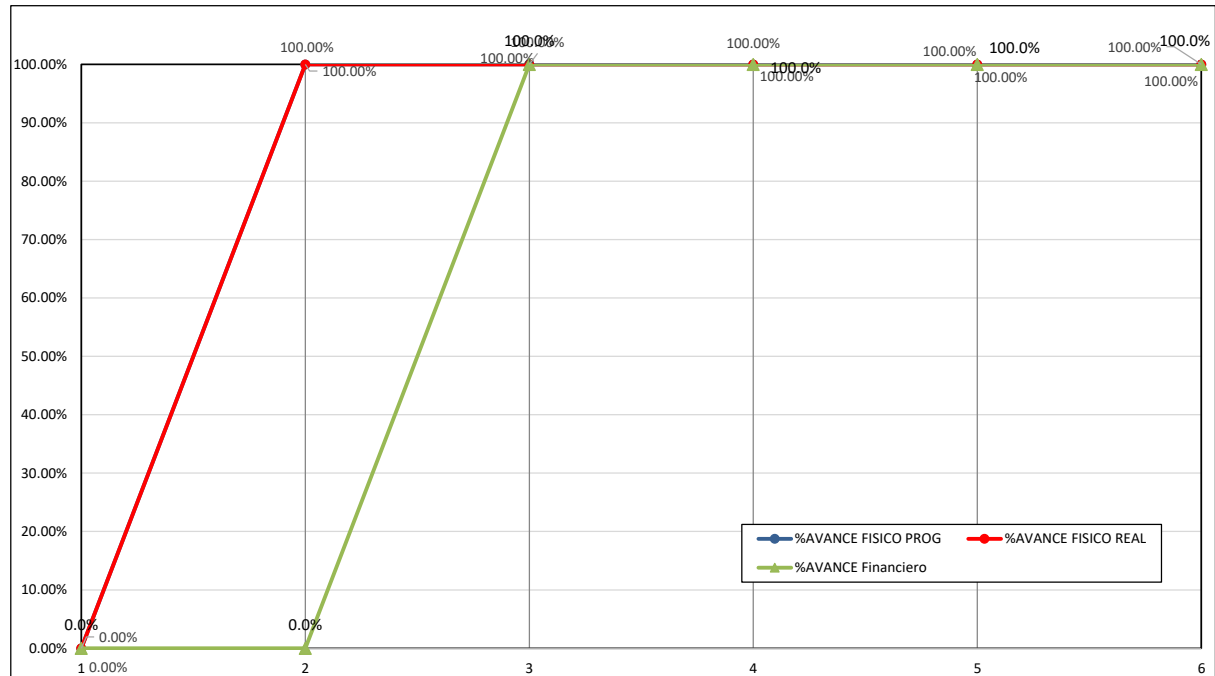

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
