

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 002/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO

Ubicación: FRACCIONAMIENTO HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FAISMUN 002/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: lunes, 4 de septiembre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: lunes, 4 de septiembre de 2023

Monto Contratado: \$1,030,574.62


Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: miércoles, 18 de octubre de 2023

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 18 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	15/09/2023	32.11%	32.12%	50.0%
3	30/09/2023	66.74%	66.75%	50.0%
4	15/10/2023	93.45%		
5	30/10/2023	100.00%		
6	15/11/2023	100.00%		
7	30/11/2023	100.00%		
8	15/12/2023	100.00%		
9	30/12/2023	100.00%		

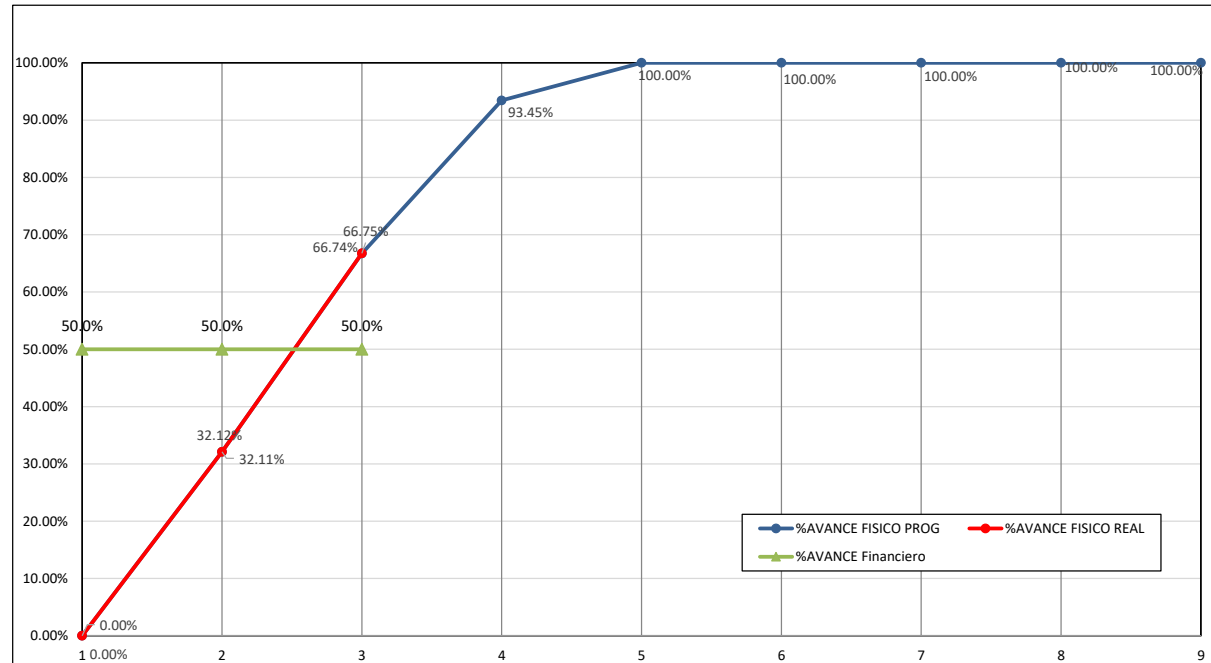

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
