


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 005/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE
 FAISMUN 010/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE
Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 005 010 022/2023
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V.
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** lunes, 4 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 45
 SC AGUA POTABLE
 SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN
Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN **Inicio Real:** lunes, 4 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,507,146.55
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** miércoles, 18 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**
Fin Real: miércoles, 18 de octubre de 2023

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 04/09/2023 | 0.00% | 0.00% | 50.0% |
| 2 | 11/09/2023 | 8.49% | 8.51% | 50.0% |
| 3 | 18/09/2023 | 12.89% | 12.90% | 50.0% |
| 4 | 25/09/2023 | 30.38% | 30.40% | 50.0% |
| 5 | 02/10/2023 | 62.09% | | |
| 6 | 09/10/2023 | 80.08% | | |
| 7 | 16/10/2023 | 99.57% | | |
| 8 | 23/10/2023 | 100.00% | | |
| 9 | 30/10/2023 | 100.00% | | |

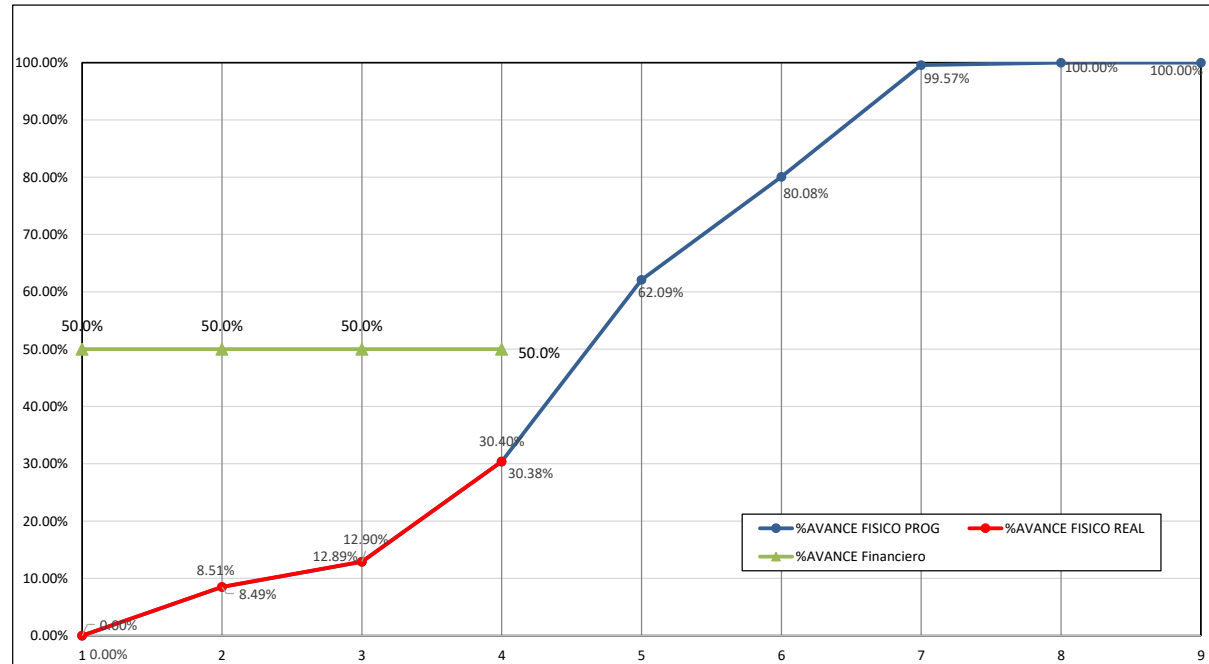

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
