

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 006/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE FAISMUN 015/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE FAISMUN 023/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS SANTA TERESA DE AVENIDA CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS FAISMUN 024/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

**Programa:** SD ALCANTARILLADO  
SC AGUA POTABLE  
SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN  
01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  
01 CONCRETO

**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Contrato:** FAISMUN 006 015 023 024/2023

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Inicio Vigente:** lunes, 14 de agosto de 2023

**Días de Obra:** 120

**Inicio Real:** lunes, 14 de agosto de 2023


**Monto Contratado:** \$5,881,885.35

**Fin Vigente:** lunes, 11 de diciembre de 2023

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** lunes, 11 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/08/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	19/08/2023	2.56%	2.57%	50.0%
3	26/08/2023	5.43%	5.45%	50.0%
4	02/09/2023	8.91%	8.92%	50.0%
5	09/09/2023	19.36%	19.37%	58.6%
6	16/09/2023	29.80%	29.82%	66.3%
7	23/09/2023	40.25%	40.27%	66.3%
8	30/09/2023	43.54%	43.56%	66.3%
9	07/10/2023	45.90%		
10	14/10/2023	47.65%		
11	21/10/2023	48.90%		
12	28/10/2023	52.80%		
13	04/11/2023	56.70%		
14	11/11/2023	60.60%		
15	18/11/2023	71.85%		
16	25/11/2023	83.10%		
17	02/12/2023	94.35%		
18	09/12/2023	99.65%		
19	16/12/2023	100.00%		
20	23/12/2023	100.00%		
21	30/12/2023	100.00%		

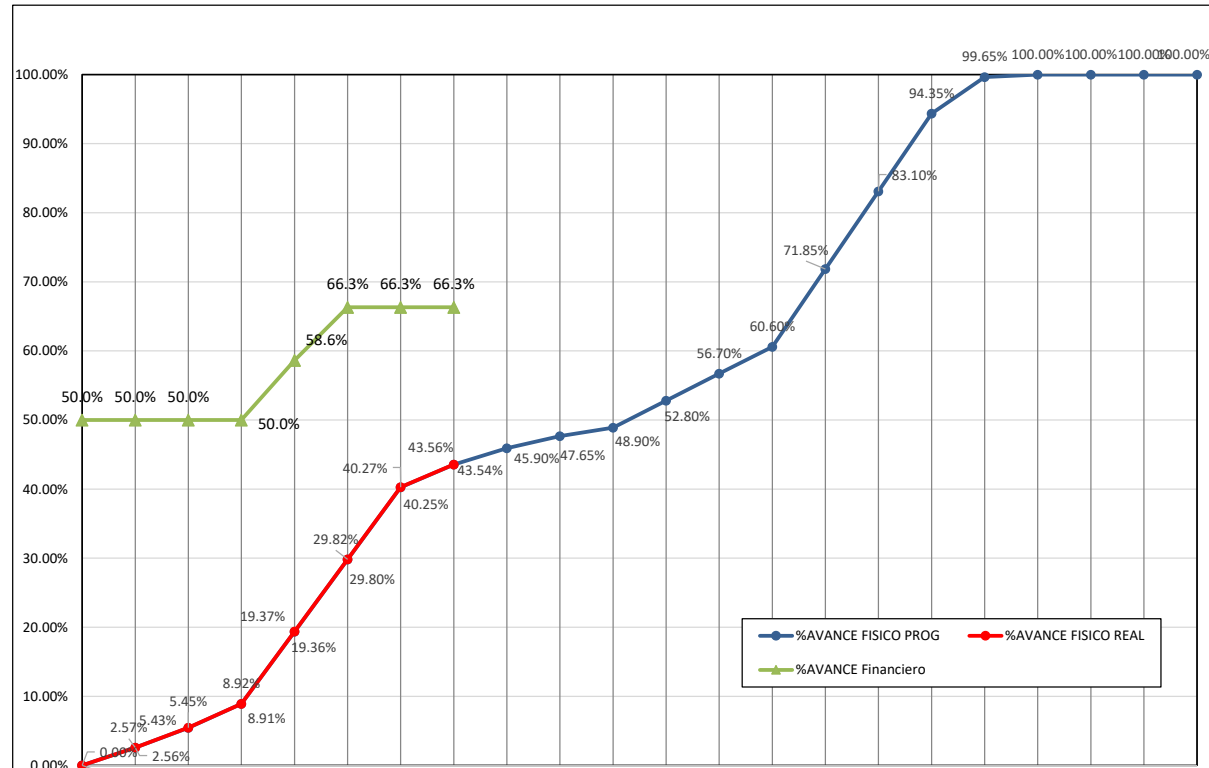

22	06/01/2024	100.00%		
----	------------	---------	--	--

1	0.00%	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
