


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FAISMUN 007/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE FAISMUN 016/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE		
Ubicación:	LA GUAYANA RANCHO SECO	Contrato:	FAISMUN 007 016/2023
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023	Contratista:	LEOPOLDO MORONES FONSECA
Programa:	SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	lunes, 4 de septiembre de 2023
Subprograma:	01 REHABILITACIÓN	Inicio Real:	lunes, 4 de septiembre de 2023
Residente:	URB. SERGIO MARQUEZ LEON	Fin Vigente:	martes, 3 de octubre de 2023
		Fin Real:	martes, 3 de octubre de 2023
		Días de Obra:	30
		Monto Contratado:	\$835,980.24
		Monto Ejercido:	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.26%	0.27%	50.0%
2	09/09/2023	5.28%	5.30%	50.0%
3	16/09/2023	37.22%	37.24%	50.0%
4	23/09/2023	78.78%	78.80%	50.0%
5	30/09/2023	99.65%	99.65%	50.0%
6	07/10/2023	100.00%		
7	14/10/2023	100.00%		
8	21/10/2023	100.00%		
9	28/10/2023	100.00%		

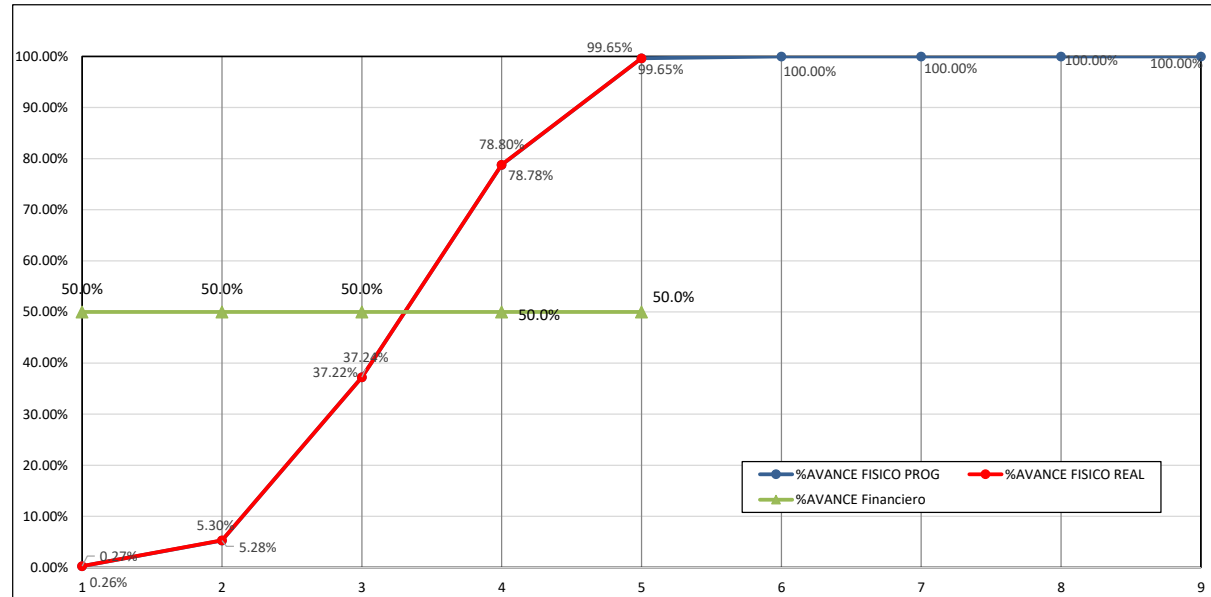

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
