


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 008/2023 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO
 FAISMUN 013/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO
Ubicación: FAISMUN 020/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO
 COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 008 013 020/2023
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** lunes, 4 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 45
 SC AGUA POTABLE **Inicio Real:** lunes, 4 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,686,803.14
 SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Fin Vigente:** miércoles, 18 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**
Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN **Fin Real:** miércoles, 18 de octubre de 2023
 01 REHABILITACION
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	11/09/2023	2.78%	2.80%	50.0%
3	18/09/2023	61.23%	61.24%	50.0%
4	25/09/2023	92.99%	92.99%	50.0%
5	02/10/2023	93.45%		
6	09/10/2023	95.14%		
7	16/10/2023	99.13%		
8	23/10/2023	100.00%		
9	30/10/2023	100.00%		

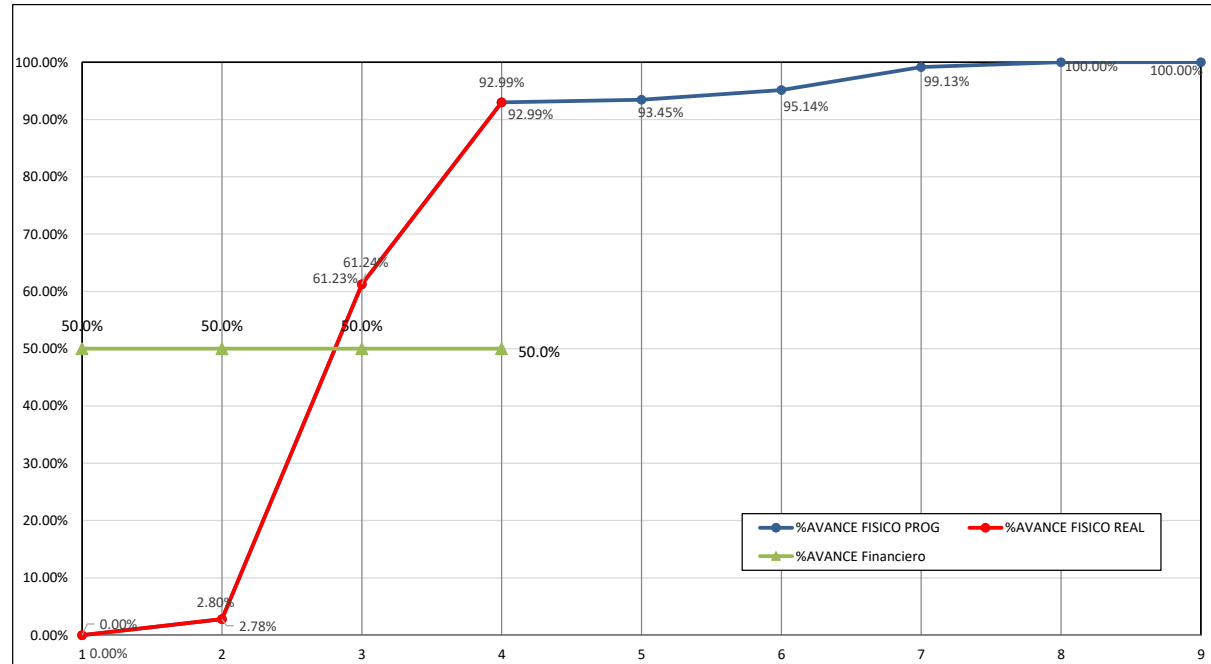

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
