


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 012/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON A AVENIDA BENITO JUÁREZ  
**Ubicación:** COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 012 019/2023  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** viernes, 4 de agosto de 2023 **Días de Obra:** 75  
**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** viernes, 4 de agosto de 2023 **Monto Contratado:** \$4,416,665.12  
**Residente:** URB. SERGIO MARQUEZ LEON **Fin Vigente:** martes, 17 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** martes, 17 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/08/2023	0.00%	0.00%	50.00%
2	09/08/2023	3.06%	3.07%	50.00%
3	16/08/2023	6.13%	6.14%	50.00%
4	23/08/2023	9.19%	9.21%	50.00%
5	30/08/2023	12.25%	12.26%	50.00%
6	06/09/2023	18.86%	18.89%	59.97%
7	13/09/2023	37.72%	37.73%	60.0%
8	20/09/2023	56.58%	56.60%	71.44%
9	27/09/2023	75.44%	75.46%	71.44%
10	04/10/2023	83.60%		
11	11/10/2023	91.76%		
12	18/10/2023	100.00%		
13	25/10/2023	100.00%		

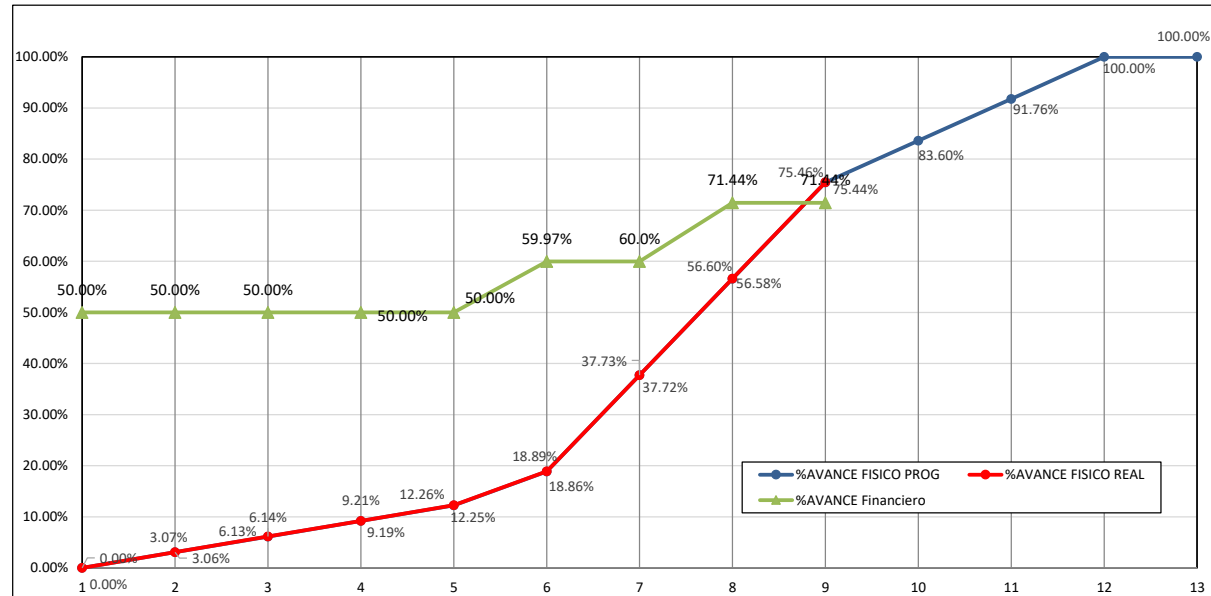

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
