

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 018/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO

**Ubicación:** COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL

**Contrato:** FAISMUN 018/2023

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

**Contratista:** EDIFICACIONES PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.

**Programa:** SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

**Inicio Vigente:** martes, 5 de septiembre de 2023

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Inicio Real:** martes, 5 de septiembre de 2023

**Monto Contratado:** \$1,749,089.34


**Residente:** ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

**Fin Vigente:** miércoles, 4 de octubre de 2023

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** miércoles, 4 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	15/09/2023	14.80%	14.82%	50.0%
3	30/09/2023	96.56%	96.57%	50.0%
4	15/10/2023	100.00%		
5	30/10/2023	100.00%		
6	15/11/2023	100.00%		

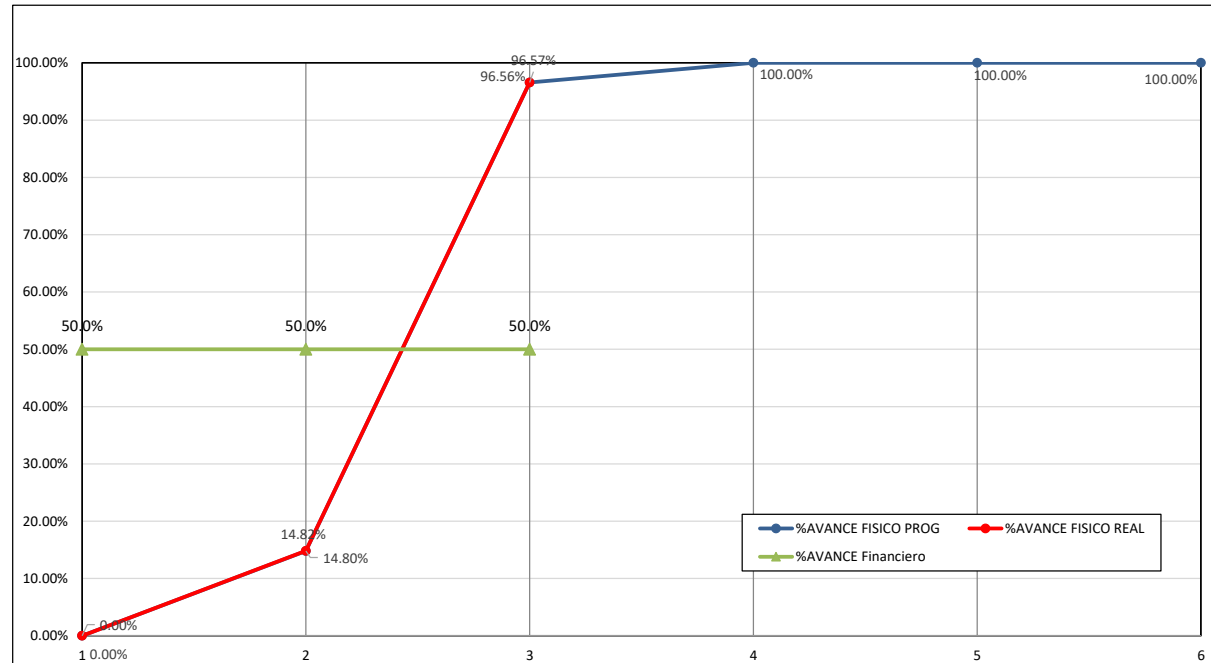

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
