

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FR 001 /2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI

Ubicación: FRACCIONAMIENTO LA RIBERA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2023
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIV
Subprograma: 02 A CONSTRUCCIÓN-PREESCOLAR
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: FR 001 /2023
Contratista: C. Edgar Joel Tapia Guzmán
Inicio Vigente: viernes, 5 de mayo de 2023
Inicio Real: viernes, 5 de mayo de 2023
Fin Vigente: lunes, 3 de julio de 2023
Fin Real: lunes, 3 de julio de 2023

Días de Obra: 60
Monto Contratado: \$867,539.42
Monto Ejercido: \$864,867.46
Se solicita Nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	49.2%
2	20/05/2023	17.09%	18.00%	49.2%
3	02/06/2023	46.36%	48.56%	56.3%
4	19/06/2023	83.88%	85.60%	67.6%
5	04/07/2023	100.00%	100.00%	89.7%
6	19/07/2023	100.00%	100.00%	99.7%

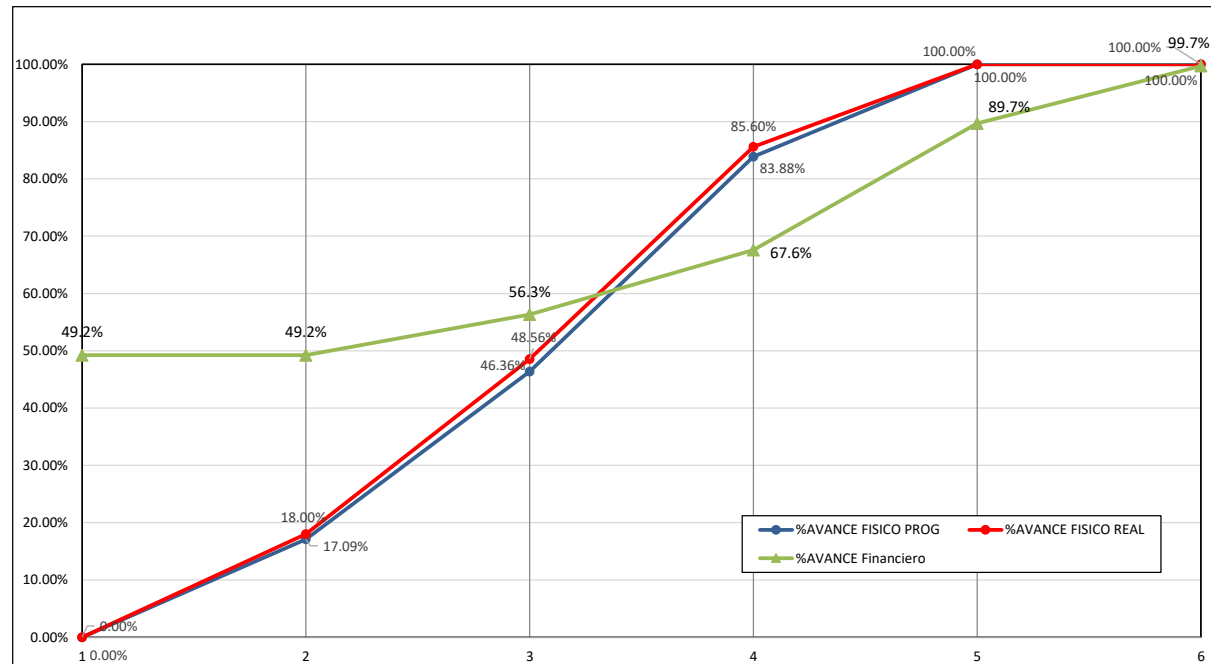

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
