

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FR 002 /2023 CONSTRUCCION DE MONUMENTO "SANTA CRUZ"

**Ubicación:** CALLE EMILIO CARRANZA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO  
**Tipo de inversión:** COLONIA CENTRO. CABECERA MUNICIPAL.  
 FONDO RESARCITORIO 2023

**Programa:** UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

**Subprograma:** 02 CONSTRUCCION Y AMPLIACION

**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

**Contrato:** FR 002 /2023

**Contratista:** GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.


**Inicio Vigente:** lunes, 11 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 30

**Inicio Real:** lunes, 11 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$1,016,614.87

**Fin Vigente:** martes, 10 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:** martes, 10 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/09/2023	11.82%	11.84%	50.0%
2	25/09/2023	42.12%	42.14%	50.0%
3	02/10/2023	70.26%		
4	10/10/2023	100.00%		
5	24/10/2023	100.00%		
6	08/11/2023	100.00%		

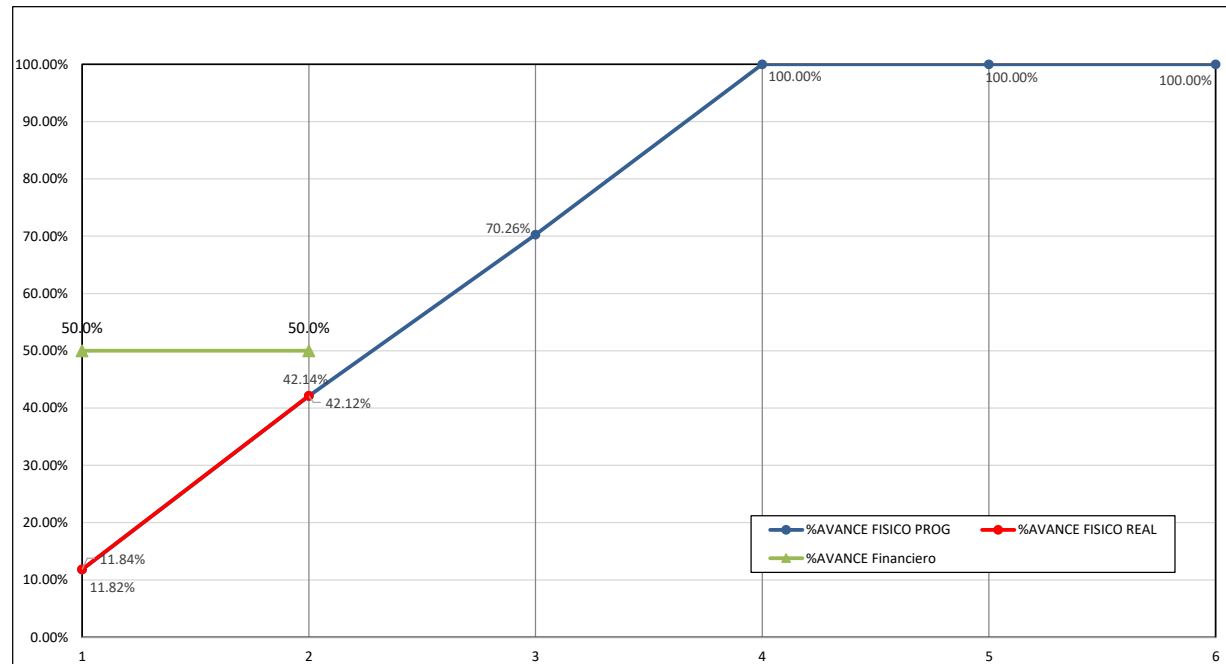

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
