


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2023REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)
Ubicación: VIÑEDOS RIBIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IPR 001 /2023
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022 **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** jueves, 3 de agosto de 2023 **Días de Obra:** 60
Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** jueves, 3 de agosto de 2023 **Monto Contratado:** \$ 1,613,798.22
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** domingo, 1 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**
Fin Real: domingo, 1 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/08/2023	0.35%	0.38%	50.0%
2	14/08/2023	1.56%	1.58%	50.0%
3	21/08/2023	10.97%	10.99%	50.0%
4	28/08/2023	36.29%	36.30%	55.6%
5	04/09/2023	63.11%	63.14%	55.6%
6	11/09/2023	86.63%	86.66%	55.6%
7	18/09/2023	92.73%	92.74%	55.6%
8	25/09/2023	97.64%	97.66%	55.6%
9	02/10/2023	100.00%		
10	09/10/2023	100.00%		
11	16/10/2023	100.00%		

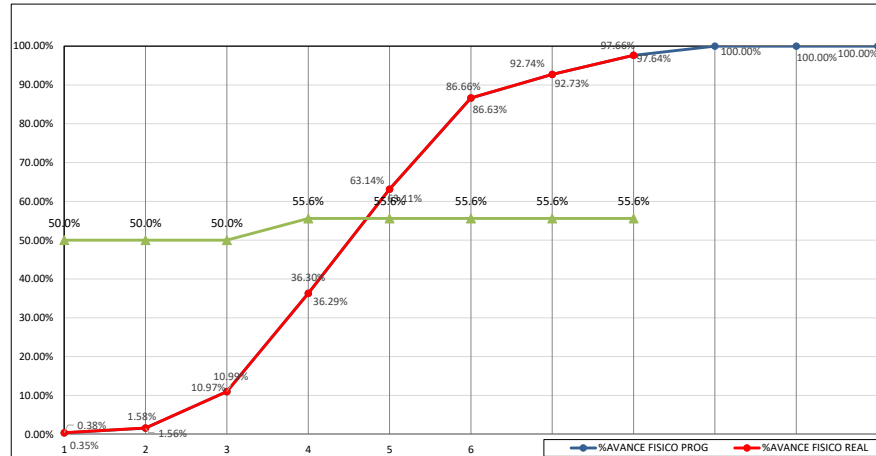

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
