

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMILLO TRAMO DE CALLE FCO. PONCE - SABINO, (1ERA ETAPA).

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022
Tipo de inversión: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Contrato: PFR 001/2022
Contratista: C. ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Programa: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Vigente: viernes, 5 de mayo de 2023

Días de Obra: 60

Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: viernes, 5 de mayo de 2023

Monto Contratado: \$ 1,746,433.73

Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON


Fin Vigente: lunes, 3 de julio de 2023

Monto Ejercido: \$ 1,746,270.43

Fin Real: lunes, 3 de julio de 2023

Se solicita Nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2023	0.00%	0.00%	40.8%
2	15/05/2023	2.62%	2.64%	40.8%
3	30/05/2023	30.32%	30.35%	40.8%
4	15/06/2023	46.91%	46.92%	49.5%
5	30/06/2023	96.60%	96.62%	72.0%
6	15/07/2023	100.00%	100.00%	80.8%
7	30/07/2023	100.00%	100.00%	82.8%
8	14/08/2023	100.00%	100.00%	99.99%
9	29/08/2023	100.00%	100.00%	99.99%

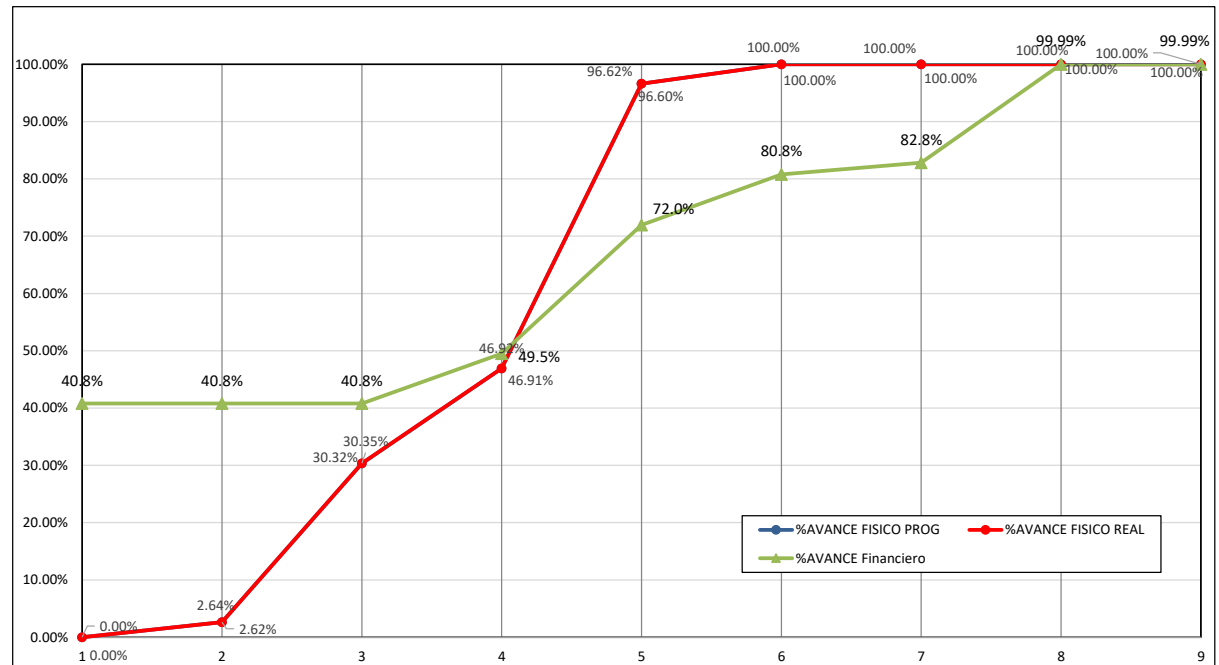

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
