


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 001/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO
 FAISMUN 009/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE PRIMERO DE MAYO
Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 001 009/2023
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** jueves, 10 de agosto de 2023 **Días de Obra:** 30
 SC AGUA POTABLE
Subprograma: 01 REHABILITACION **Inicio Real:** jueves, 10 de agosto de 2023 **Monto Contratado:** \$341,443.09
 03 CONSTRUCCIÓN
Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** viernes, 8 de septiembre de 2023 **Monto Ejercido:**
Fin Real: viernes, 8 de septiembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/08/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	16/08/2023	20.87%	20.88%	50.0%
3	23/08/2023	61.17%	61.19%	50.0%
4	24/08/2023	91.45%	91.46%	50.0%
5	30/08/2023	98.21%	98.23%	50.0%
6	08/09/2023	100.00%	100.00%	89.9%
7	17/09/2023	100.00%	100.00%	89.9%
8	26/09/2023	100.00%	100.00%	89.9%
9	P	100.00%	100.00%	

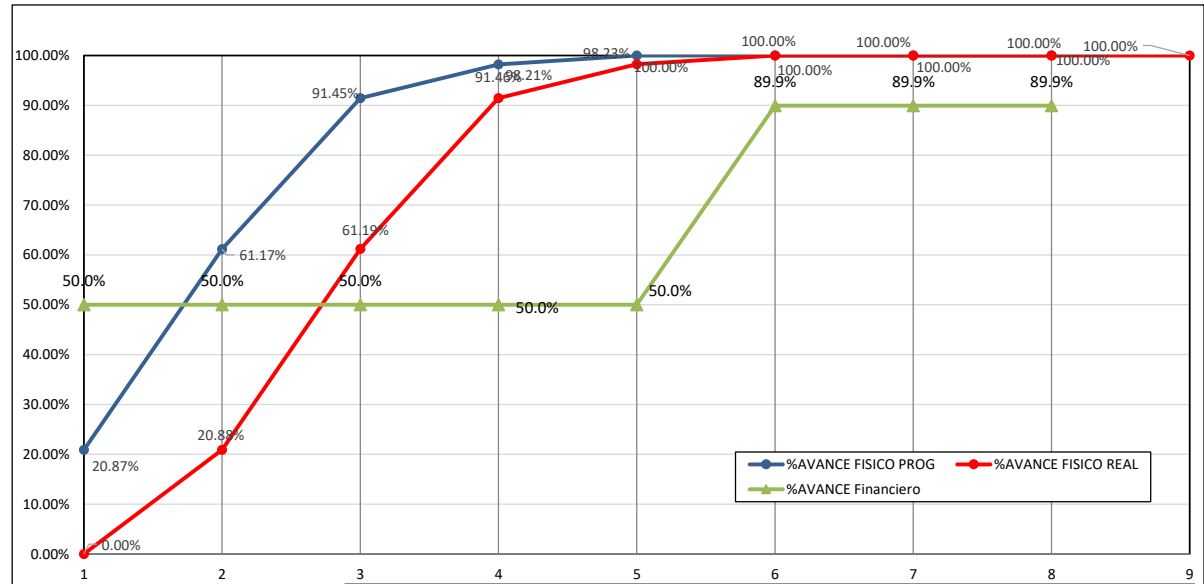

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
