

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 004/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO
 FAISMUN 011/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO
 FAISMUN 021/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO

Ubicación: FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 004 011 021/2023


Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** lunes, 29 de agosto de 2022 **Días de Obra:** 30
 SC AGUA POTABLE
 SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN **Inicio Real:** lunes, 29 de agosto de 2022 **Monto Contratado:** \$734,736.47
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** martes, 27 de septiembre de 2022 **Monto Ejercido:**
Fin Real: martes, 27 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	05/09/2022	0.30%	0.32%	50.0%
3	12/09/2022	4.28%	4.30%	50.0%
4	19/09/2022	41.53%	41.55%	50.0%
5	25/09/2022	79.39%	79.41%	50.0%
6	02/10/2022	100.00%		
7	09/10/2022	100.00%		
8	16/10/2022	100.00%		
9	23/10/2022	100.00%		

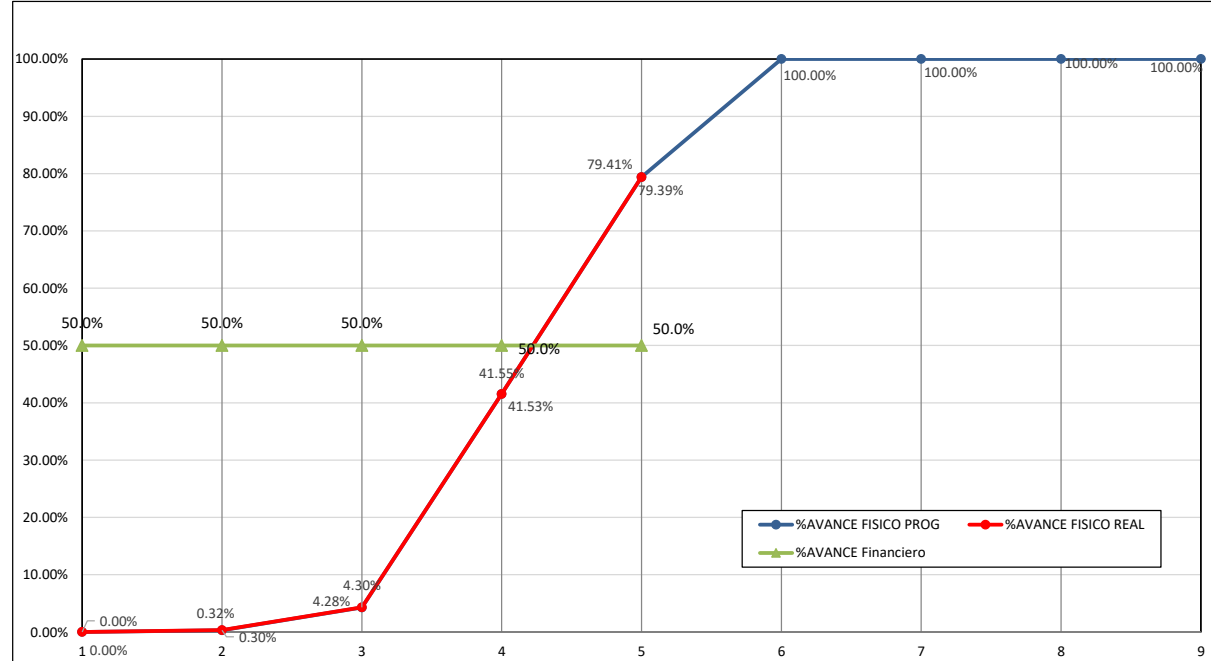

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
