

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 017/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PARRAS DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE FRANCISCO VILLA

Ubicación: LA ESCONDIDA (EL SALERO)

Contrato: FAISMUN 017/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.

Programa: SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: martes, 29 de agosto de 2023

Días de Obra: 30

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: martes, 29 de agosto de 2023

Monto Contratado: \$674,227.79


Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON

Fin Vigente: miércoles, 27 de septiembre de 2023

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 27 de septiembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/08/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	15/09/2023	73.33%	73.35%	50.0%
3	30/09/2023	100.00%	100.00%	50.0%
4	15/10/2023	100.00%		
5	30/10/2023	100.00%		
6	14/11/2023	100.00%		

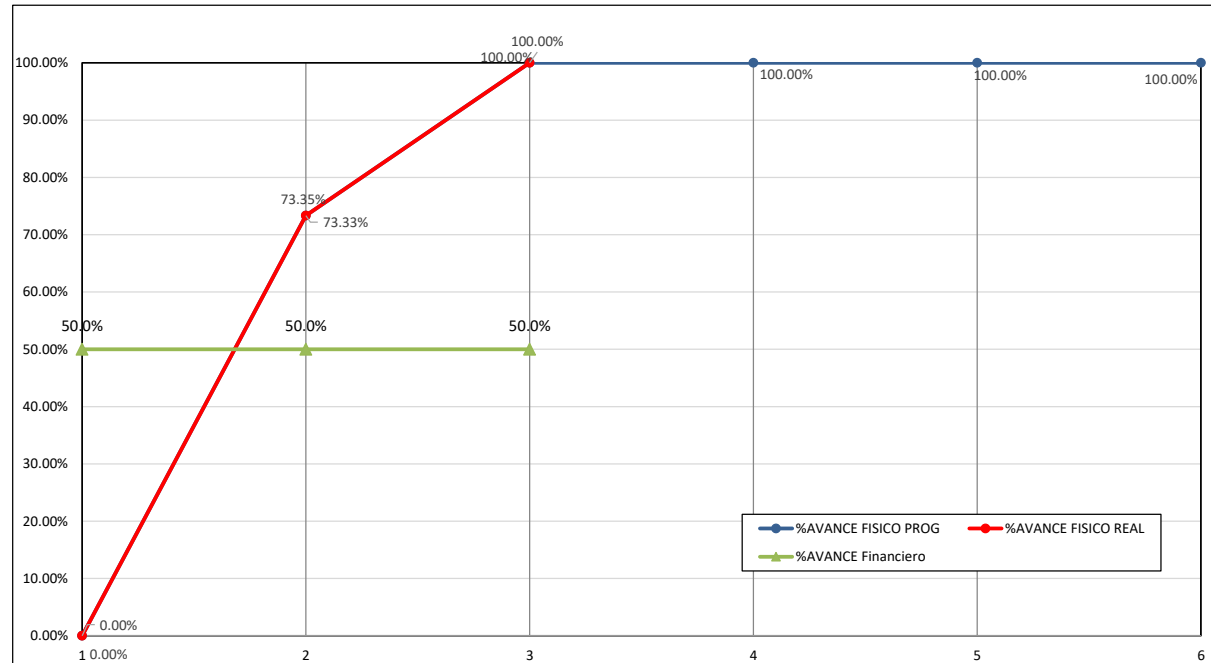

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
