

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 030/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CIRCUITO ESCUELAS  
FAISMUN 031/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CIRCUITO ESCUELAS

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN

**Contrato:** FAISMUN 030 031/2023

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

**Contratista:** C. BENJAMIN MACIAS GASPAR

**Programa:** SD ALCANTARILLADO  
SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** viernes, 15 de septiembre de 2023

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 01 REHABILITACION

**Inicio Real:** viernes, 15 de septiembre de 2023

**Monto Contratado:** \$523,930.69


**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** sábado, 14 de octubre de 2023

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** sábado, 14 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2023	0.63%	0.65%	0.0%
2	23/09/2023	5.14%	5.16%	0.0%
3	30/09/2023	37.67%	37.68%	0.0%
4	07/10/2023	74.19%		
5	14/10/2023	100.00%		
6	21/10/2023	100.00%		

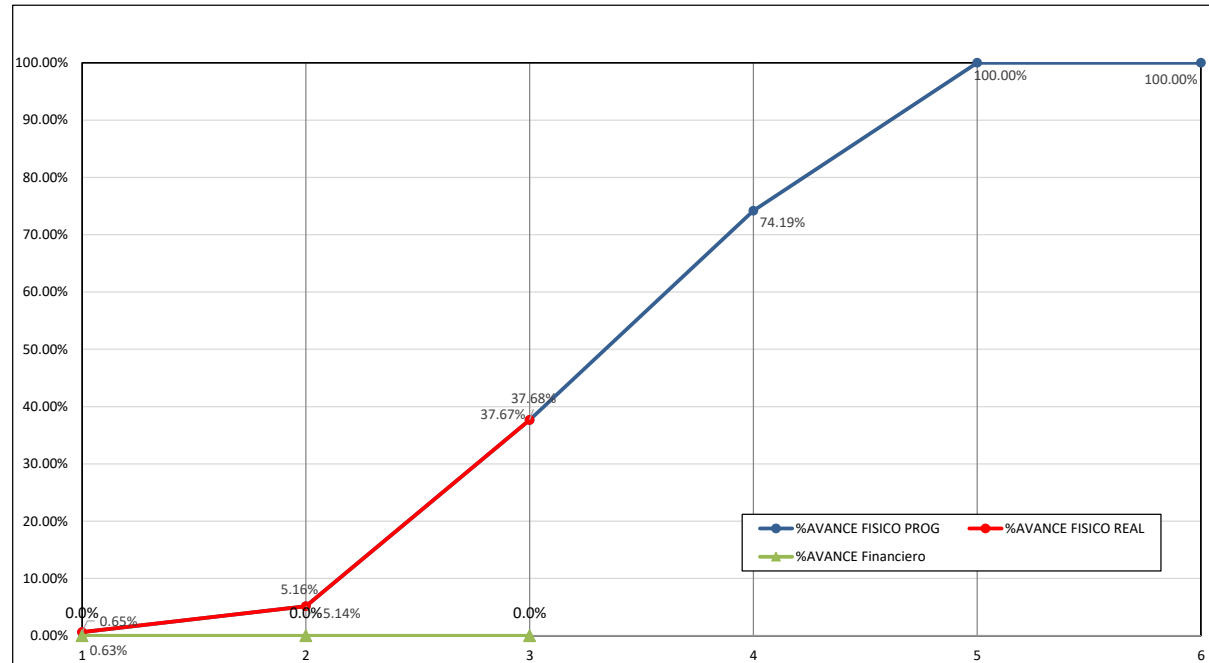

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
