

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FR 003/2023 REHABILITACION DE EXPLANADA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ubicación:** AV. JUÁREZ, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Tipo de inversión:** FONDO RESARCITORIO 2023

**Programa:** SE URBANIZACIÓN

**Subprograma:** 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES

**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Contrato:** FR 003 /2023

**Contratista:** REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENT


**Inicio Vigente:** martes, 19 de septiembre de 2023 **Días de Obra:** 30

**Inicio Real:** martes, 19 de septiembre de 2023 **Monto Contratado:** \$693,207.85

**Fin Vigente:** miércoles, 18 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:** miércoles, 18 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	25/09/2023	0.80%	0.82%	50.0%
3	02/10/2023	21.43%		
4	09/10/2023	43.66%		
5	16/10/2023	78.54%		
6	23/10/2023	100.00%		

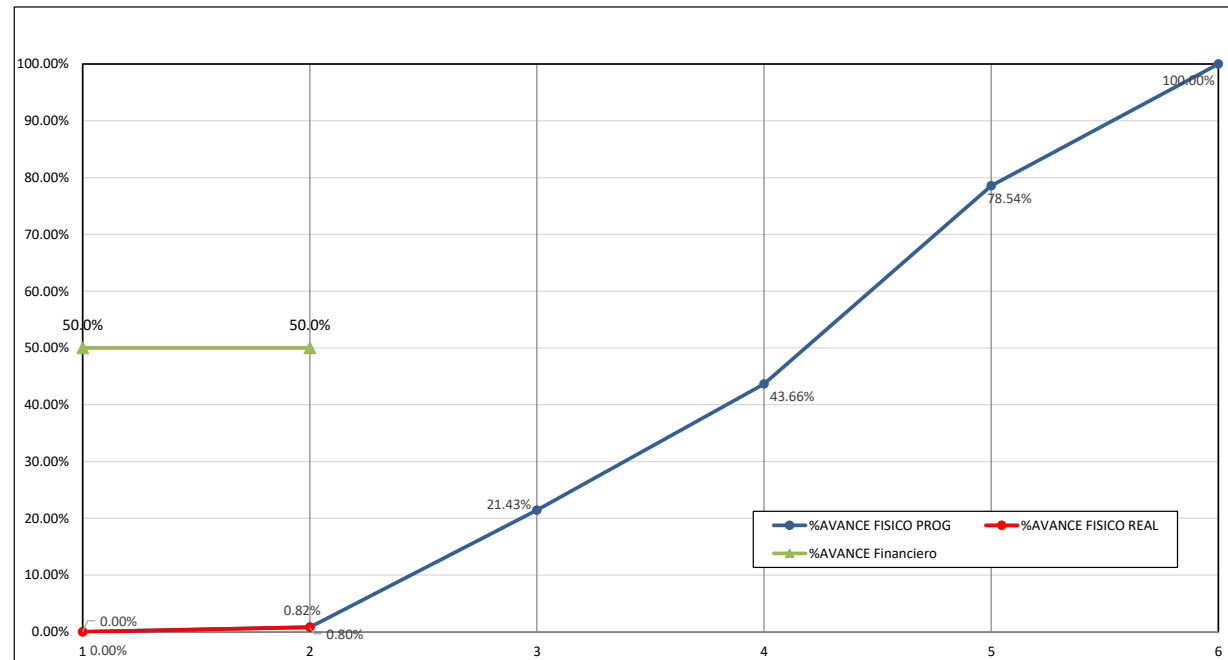

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
