


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 C/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 5 OBRAS Y 2 PROYECTOS ESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP 001 C/2023
Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023 **Contratista:** ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** viernes, 31 de marzo de 2023 **Días de Obra:** 270
Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** viernes, 31 de marzo de 2023 **Monto Contratado:** \$137,069.08
Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS **Fin Vigente:** lunes, 25 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:** \$137,069.08
Fin Real: lunes, 25 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/03/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	09/04/2023	33.85%	35.97%	0.0%
3	23/04/2023	36.09%	35.97%	0.0%
4	07/05/2023	38.34%	35.97%	0.0%
5	21/05/2023	43.20%	48.87%	0.0%
6	04/06/2023	45.45%	55.60%	0.0%
7	18/06/2023	56.83%	71.38%	0.0%
8	02/07/2023	60.38%	71.38%	0.0%
9	16/07/2023	63.94%	74.94%	57.8%
10	30/07/2023	65.25%	79.81%	57.8%
11	13/08/2023	65.25%	90.47%	57.8%
12	27/08/2023	67.49%	90.47%	57.8%
13	10/09/2023	69.73%	92.71%	57.8%
14	24/09/2023	74.60%	92.71%	57.8%
15	08/10/2023	84.67%		
16	22/10/2023	88.23%		
17	05/11/2023	88.23%		
18	19/11/2023	91.78%		
19	03/12/2023	94.02%		
20	17/12/2023	96.27%		
21	31/12/2023	100.00%		
22	14/01/2024	100.00%		

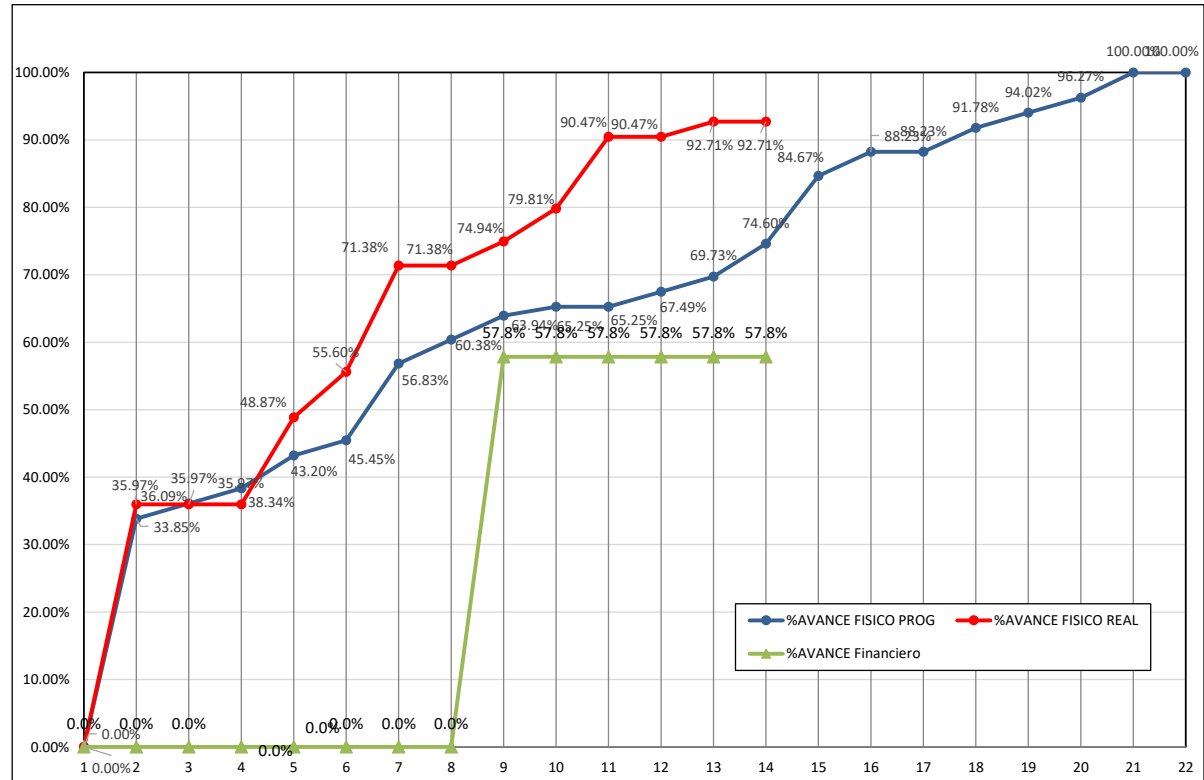

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
