

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 F/2023 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA MONUMENTO A LA SANTA CRUZ Y CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE SANTA CRUZ, SOBRE EL FINAL DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 F/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023

Contratista: Ing. Luis Gerardo del Muro Caldera

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: martes, 9 de mayo de 2023

Días de Obra: 15

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: martes, 9 de mayo de 2023

Monto Contratado: \$56,840.00


Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: martes, 23 de mayo de 2023

Monto Ejercido: \$56,840.00

Fin Real: martes, 23 de mayo de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/05/2023	0.00%	0.00%	0.0%
2	23/05/2023	100.00%	100.00%	0.0%
3	07/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
4	22/06/2023	100.00%	100.00%	100.0%
5	07/07/2023	100.00%	100.00%	100.0%
6	22/07/2023	100.00%	100.00%	100.0%

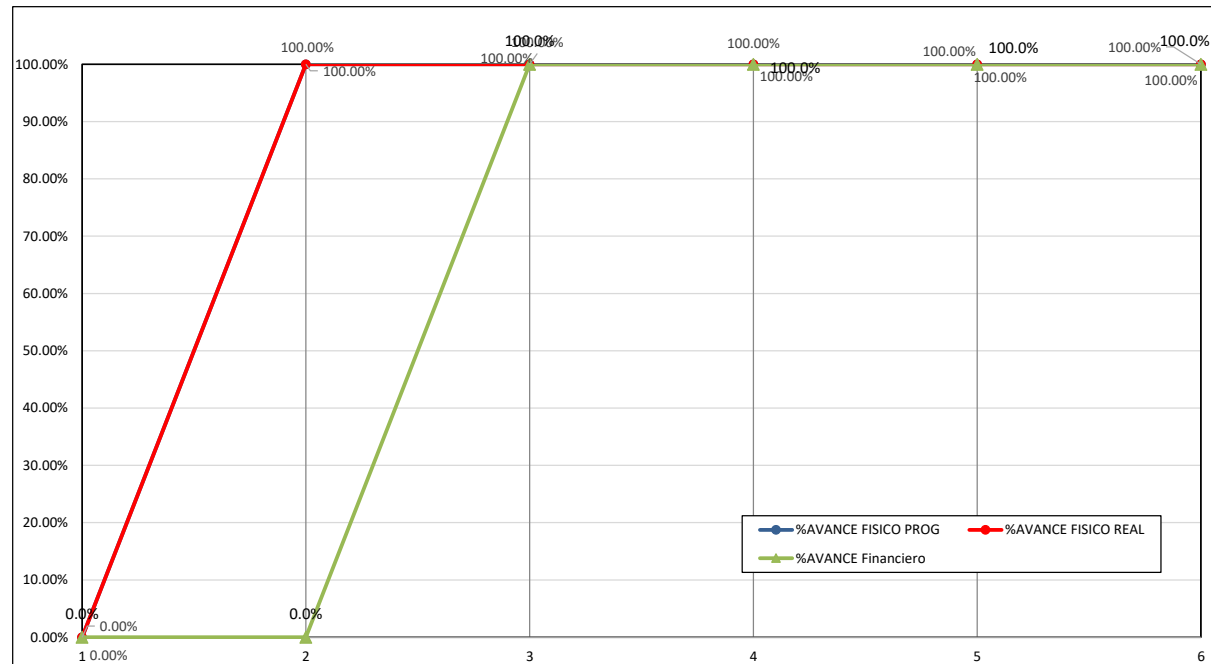

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
