

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 H/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 12 OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 H/2023

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023

Contratista: IGNACIO JIMENEZ ARMAS

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: miércoles, 19 de julio de 2023

Días de Obra: 150

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: miércoles, 19 de julio de 2023

Monto Contratado: \$149,999.97


Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS

Fin Vigente: viernes, 15 de diciembre de 2023

Monto Ejercido:

Fin Real: viernes, 15 de diciembre de 2023

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 22/07/2023 | 2.99% | 3.01% | 0.0% |
| 2 | 29/07/2023 | 8.90% | 8.94% | 0.0% |
| 3 | 05/08/2023 | 15.70% | 15.71% | 0.0% |
| 4 | 12/08/2023 | 22.80% | 22.83% | 0.0% |
| 5 | 19/08/2023 | 30.11% | 30.15% | 0.0% |
| 6 | 26/08/2023 | 37.42% | 37.44% | 0.0% |
| 7 | 02/09/2023 | 43.99% | 44.00% | 0.0% |
| 8 | 09/09/2023 | 46.07% | 46.10% | 0.0% |
| 9 | 16/09/2023 | 48.14% | 48.15% | 0.0% |
| 10 | 23/09/2023 | 50.82% | 50.85% | 0.0% |
| 11 | 30/09/2023 | 53.59% | | |
| 12 | 07/10/2023 | 56.36% | | |
| 13 | 14/10/2023 | 59.14% | | |
| 14 | 21/10/2023 | 61.91% | | |
| 15 | 28/10/2023 | 64.68% | | |
| 16 | 04/11/2023 | 70.70% | | |
| 17 | 11/11/2023 | 76.72% | | |
| 18 | 18/11/2023 | 82.74% | | |
| 19 | 25/11/2023 | 87.86% | | |
| 20 | 02/12/2023 | 92.32% | | |
| 21 | 09/12/2023 | 96.62% | | |
| 22 | 16/12/2023 | 100.00% | | |
| 23 | 23/12/2023 | 100.00% | | |

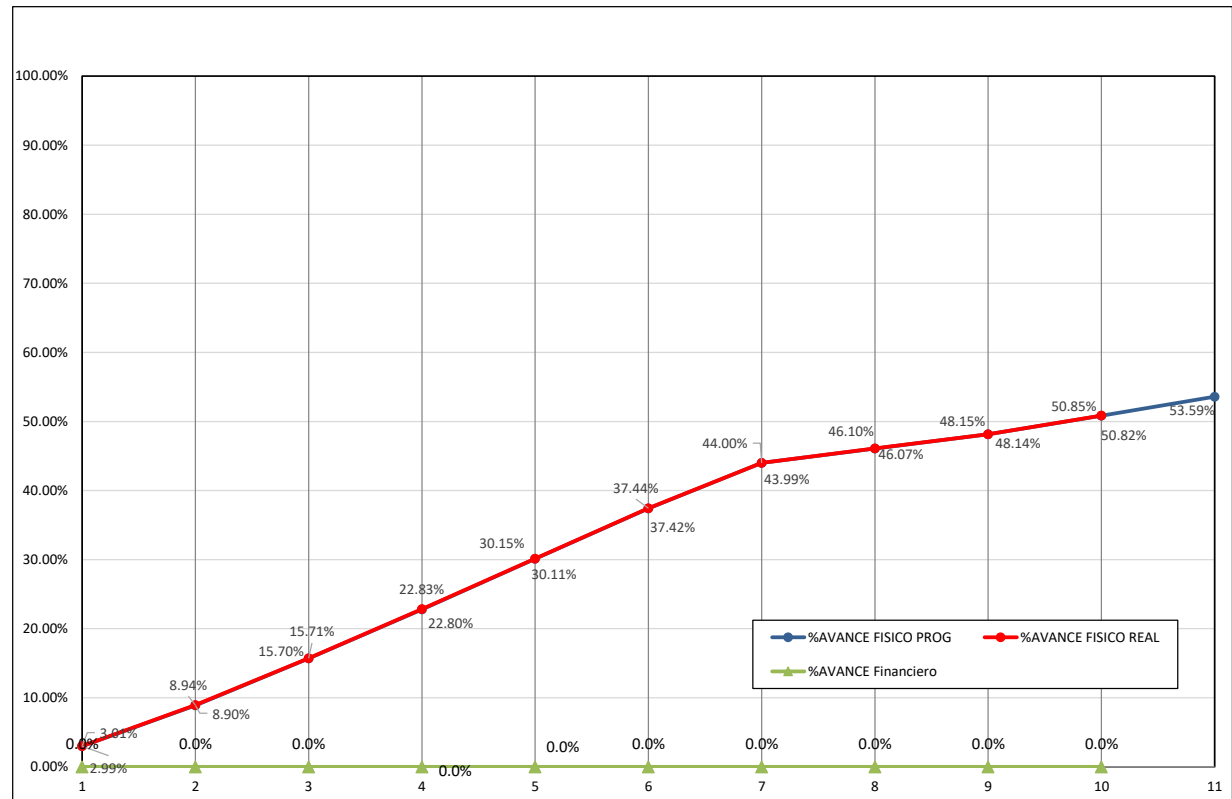

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
