


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001 I/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato: IP 001 I/2023	
Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2023	Contratista: JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente: miércoles, 19 de julio de 2023	Días de Obra: 150
Subprograma: 03 SERVICIOS	Inicio Real: miércoles, 19 de julio de 2023	Monto Contratado: \$149,918.40
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente: viernes, 15 de diciembre de 2023	Monto Ejercido:
	Fin Real: viernes, 15 de diciembre de 2023	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/07/2023	10.00%	10.02%	0.0%
2	31/07/2023	20.00%	20.01%	0.0%
3	07/08/2023	23.30%	23.31%	0.0%
4	14/08/2023	26.60%	26.61%	0.0%
5	21/08/2023	29.90%	29.90%	0.0%
6	28/08/2023	33.30%	33.35%	0.0%
7	07/09/2023	36.50%	36.52%	0.0%
8	14/09/2023	39.90%	39.91%	0.0%
9	21/09/2023	43.30%	43.32%	0.0%
10	28/09/2023	46.60%	46.62%	0.0%
11	07/10/2023	49.90%		
12	14/10/2023	53.50%		
13	21/10/2023	56.60%		
14	28/10/2023	59.90%		
15	07/11/2023	63.20%		
16	14/11/2023	66.60%		
17	21/11/2023	74.90%		
18	28/11/2023	83.20%		
19	07/12/2023	91.60%		
20	14/12/2023	100.00%		
21	21/12/2023	100.00%		
22	28/12/2023	100.00%		
23	04/01/2024	100.00%		

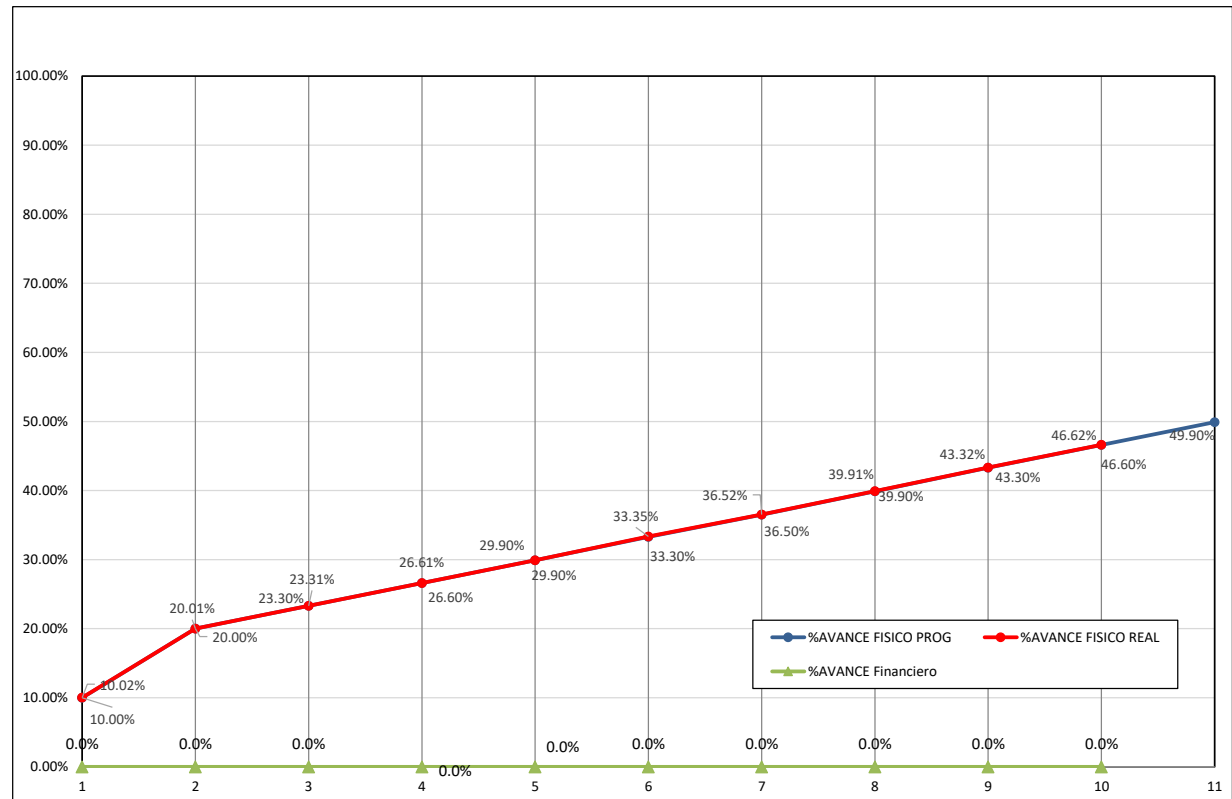

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
