


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 002/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS, CALLE FRANCISCO VILLA DE TEODORO OLIVARES A PRIV. SANTOS MARTÍNEZ, LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IPR 002/2023
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022 **Contratista:** ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** martes, 25 de julio de 2023 **Días de Obra:** 15
Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** martes, 25 de julio de 2023 **Monto Contratado:** \$ 227,610.10
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA **Fin Vigente:** martes, 8 de agosto de 2023 **Monto Ejercido:**
Fin Real: martes, 8 de agosto de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/07/2023	31.50%	31.52%	0.0%
2	04/08/2023	82.36%	82.38%	0.0%
3	11/08/2023	100.00%	100.00%	0.0%
4	18/08/2023	100.00%	100.00%	0.0%
5	25/08/2023	100.00%	100.00%	0.0%
6	01/09/2023	100.00%	100.00%	0.0%
7	08/09/2023	100.00%	100.00%	89.6%
8	15/09/2023	100.00%	100.00%	89.6%
9	22/09/2023	100.00%	100.00%	89.6%
10	29/09/2023	100.00%	100.00%	89.6%
11	06/10/2023	100.00%	100.00%	

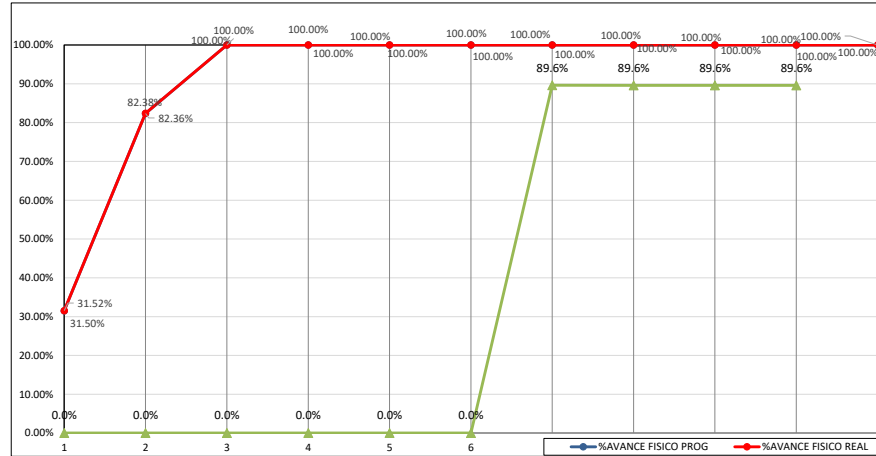

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
