


### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IPR 003/2023CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALLE NOGALES #109  
**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO      **Contrato:** IPR 003/2023  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2022      **Contratista:** BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S. A. DE C.V.  
**Programa:** SH VIVIENDA DIGNA      **Inicio Vigente:** jueves, 17 de agosto de 2023      **Días de Obra:** 30  
**Subprograma:** 02 AMPLIACION      **Inicio Real:** jueves, 17 de agosto de 2023      **Monto Contratado:** \$ 149,984.14  
**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA      **Fin Vigente:** viernes, 15 de septiembre de 2023      **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** viernes, 15 de septiembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/08/2023	0.71%	0.73%	0.0%
2	28/08/2023	21.00%	21.04%	0.0%
3	04/09/2023	66.61%	66.63%	0.0%
4	11/09/2023	76.26%	76.24%	0.0%
5	18/09/2023	100.00%	100.00%	0.0%
6	25/09/2023	100.00%	100.00%	0.0%
7	02/10/2023	100.00%	100.00%	0.0%

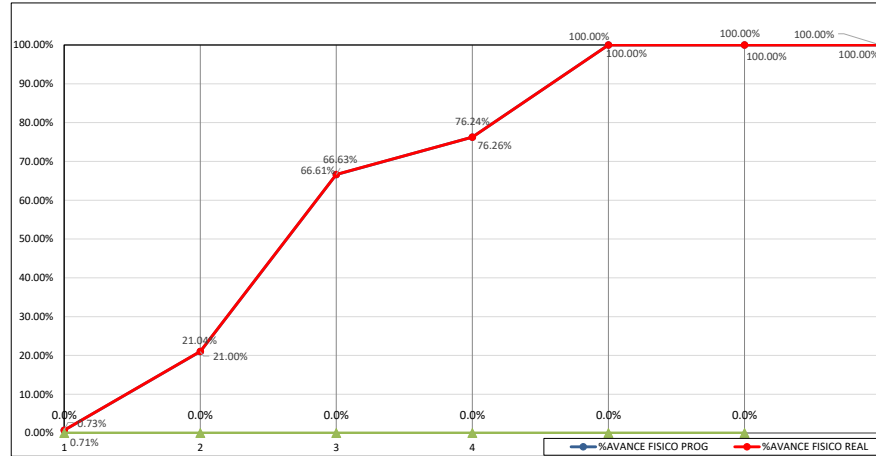

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
