

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 003/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO
 FAISMUN 014/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A RIO SAN PEDRO

Ubicación: FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FAISMUN 003 014/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ

Programa: SD ALCANTARILLADO
SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 28 de agosto de 2023

Días de Obra: 37

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: lunes, 28 de agosto de 2023

Monto Contratado: \$694,008.44


Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA

Fin Vigente: martes, 3 de octubre de 2023

Monto Ejercido: \$694,008.44

Fin Real: martes, 3 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/08/2023	0.00%	0.00%	49.2%
2	04/09/2023	4.74%	4.75%	49.2%
3	11/09/2023	11.24%	11.26%	49.2%
4	18/09/2023	24.44%	24.46%	49.2%
5	24/09/2023	53.56%	53.58%	64.1%
6	01/10/2023	97.29%	97.31%	70.4%
7	08/10/2023	100.00%	100.00%	70.4%
8	15/10/2023	100.00%	100.00%	72.5%
9	22/10/2023	100.00%	100.00%	79.9%
10	29/10/2023	100.00%	100.00%	100.0%
11	05/11/2023	100.00%	100.00%	100.0%

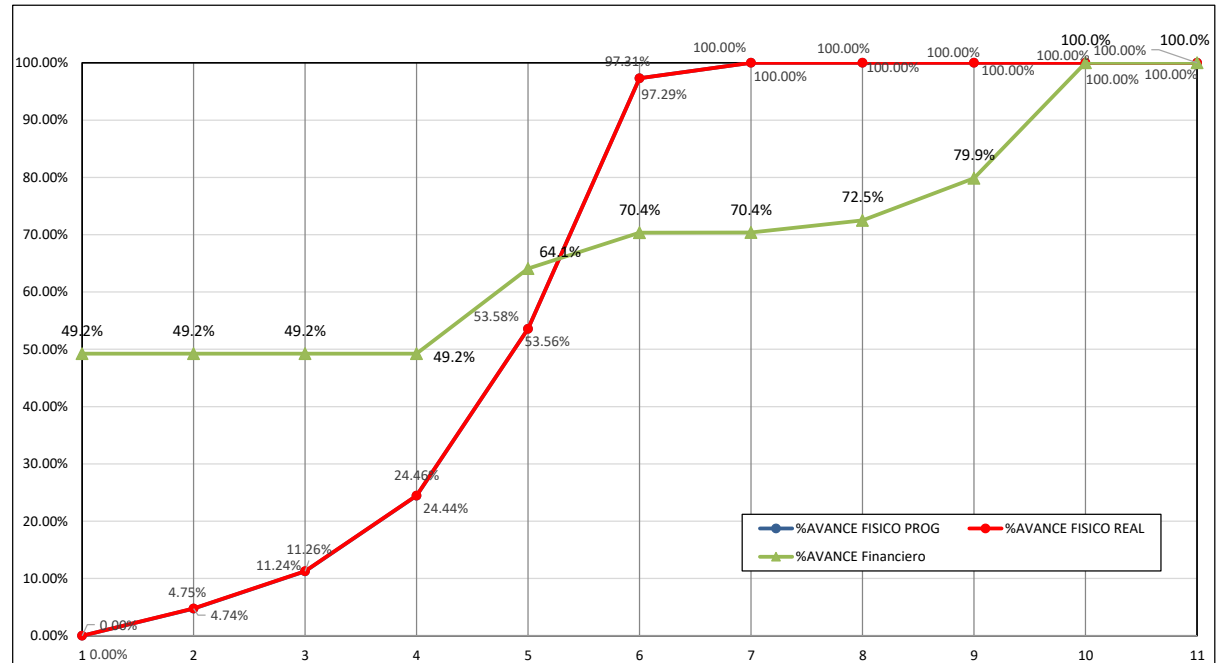

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
