

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 004/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO  
 FAISMUN 011/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO  
 FAISMUN 021/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 DE OCTUBRE DE AVENIDA PROGRESO A CALLE 5 DE FEBRERO

**Ubicación:** FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL      **Contrato:** FAISMUN 004 011 021/2023


**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023      **Contratista:** BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO      **Inicio Vigente:** lunes, 29 de agosto de 2022      **Días de Obra:** 37  
 SC AGUA POTABLE  
 SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN      **Inicio Real:** lunes, 29 de agosto de 2022      **Monto Contratado:** \$770,431.26  
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Residente:** ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA      **Fin Vigente:** martes, 4 de octubre de 2022      **Monto Ejercido:** \$770,431.26  
**Fin Real:** martes, 4 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/08/2022	0.00%	0.00%	49.6%
2	05/09/2022	0.30%	0.32%	49.6%
3	12/09/2022	4.28%	4.30%	49.6%
4	19/09/2022	41.53%	41.55%	49.6%
5	25/09/2022	79.39%	79.41%	50.3%
6	02/10/2022	98.12%	98.14%	57.7%
7	09/10/2022	100.00%	100.00%	57.7%
8	16/10/2022	100.00%	100.00%	91.9%
9	23/10/2022	100.00%	100.00%	91.9%
10	02/11/2022	100.00%	100.00%	100.0%

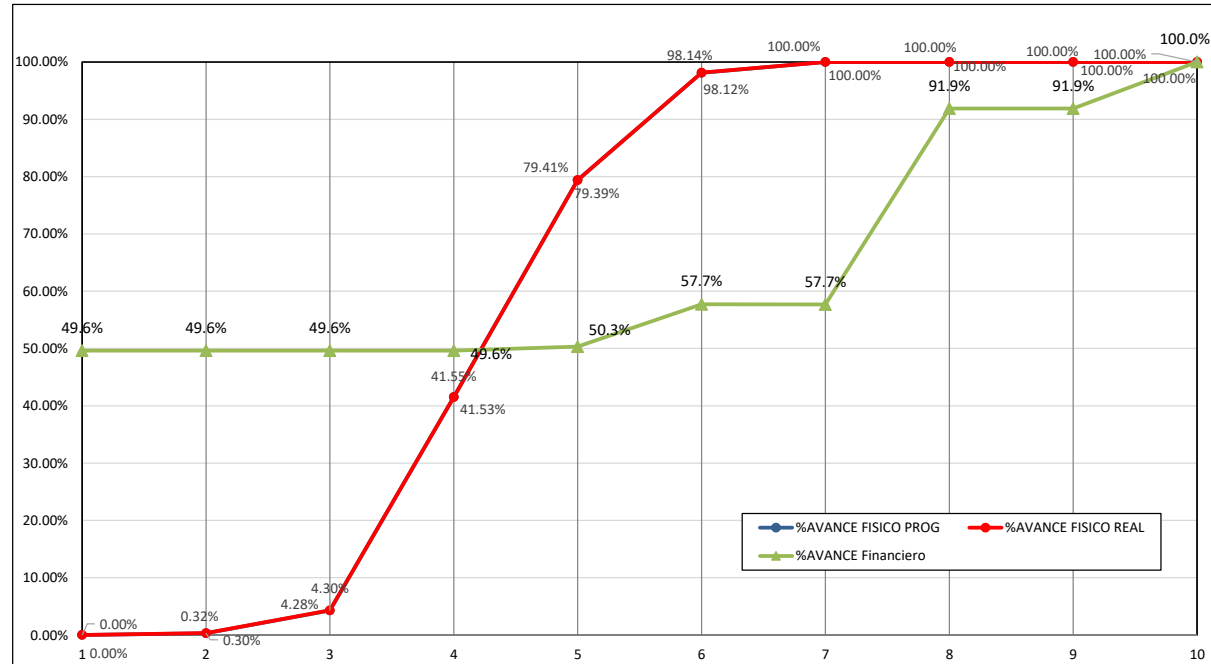

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
