


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FAISMUN 005/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE FAISMUN 010/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 5 DE FEBRERO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE		
Ubicación:	COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL	Contrato:	FAISMUN 005 010 022/2023
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023	Contratista:	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V.
Programa:	SD ALCANTARILLADO SC AGUA POTABLE SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN	Inicio Vigente:	lunes, 4 de septiembre de 2023
Subprograma:	03 CONSTRUCCIÓN 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	lunes, 4 de septiembre de 2023
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	Fin Vigente:	miércoles, 18 de octubre de 2023
		Fin Real:	miércoles, 18 de octubre de 2023
		Días de Obra:	45
		Monto Contratado:	\$1,507,146.56
		Monto Ejercido:	\$1,507,146.56

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	11/09/2023	8.49%	8.51%	50.0%
3	18/09/2023	12.89%	12.90%	50.0%
4	25/09/2023	30.38%	30.40%	66.4%
5	02/10/2023	62.09%	62.09%	92.9%
6	09/10/2023	80.08%	80.10%	92.9%
7	16/10/2023	99.57%	99.58%	92.9%
8	23/10/2023	100.00%	100.00%	92.9%
9	31/10/2023	100.00%	100.00%	100.0%

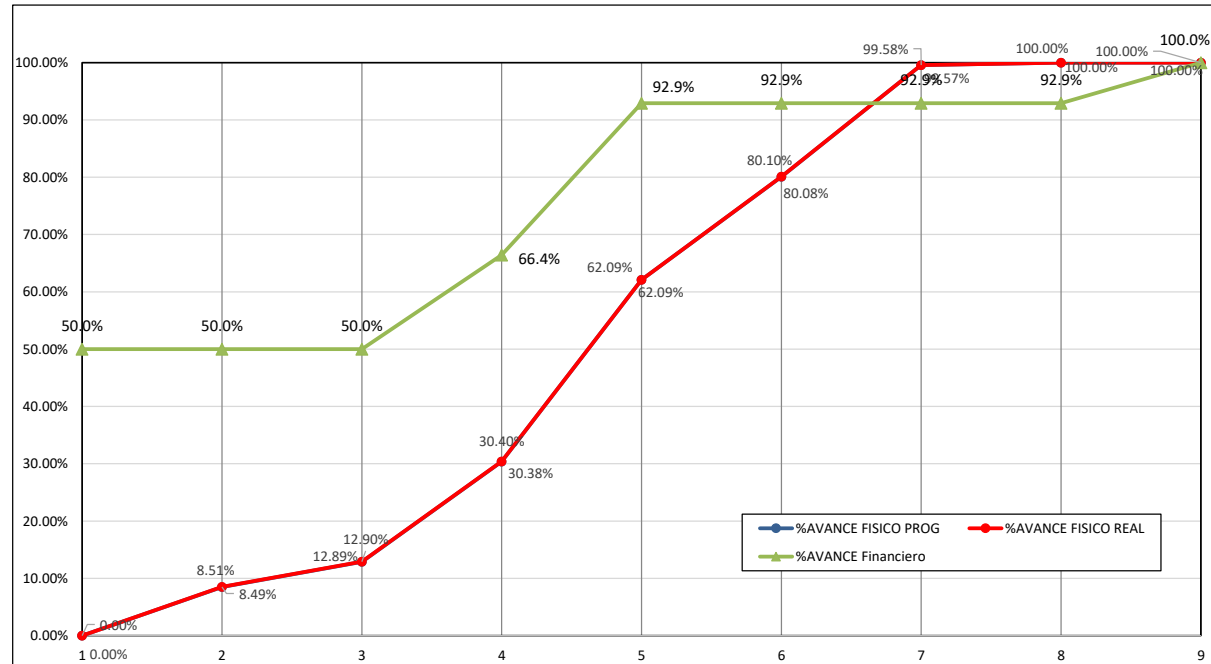

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
