

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 006/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE
 FAISMUN 015/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE
 FAISMUN 023/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS SANTA TERESA DE AVENIDA CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS
 FAISMUN 024/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE

Ubicación: LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 006 015 023 024/2023
 EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** lunes, 14 de agosto de 2023 **Días de Obra:** 120
 SC AGUA POTABLE
 SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** lunes, 14 de agosto de 2023 **Monto Contratado:** \$5,885,119.39
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
 01 CONCRETO

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** lunes, 11 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:** \$5,885,119.39
Fin Real: lunes, 11 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/08/2023	0.00%	0.00%	49.97%
2	19/08/2023	2.56%	2.57%	49.97%
3	26/08/2023	5.43%	5.45%	49.97%
4	02/09/2023	8.91%	8.92%	49.97%
5	09/09/2023	19.36%	19.37%	49.97%
6	16/09/2023	29.80%	29.82%	68.3%
7	23/09/2023	40.25%	40.27%	68.3%
8	30/09/2023	43.54%	43.56%	69.8%
9	07/10/2023	45.90%	45.92%	69.8%
10	14/10/2023	47.65%	47.66%	70.0%
11	21/10/2023	48.90%	48.91%	70.0%
12	28/10/2023	52.80%	52.83%	70.0%
13	04/11/2023	56.70%	56.74%	71.3%
14	11/11/2023	60.60%	60.62%	71.3%
15	18/11/2023	71.85%	71.86%	73.9%
16	25/11/2023	83.10%	83.12%	73.9%
17	02/12/2023	94.35%	94.37%	89.5%
18	09/12/2023	99.65%	99.66%	96.8%
19	16/12/2023	100.00%	100.00%	98.8%
20	23/12/2023	100.00%	100.00%	100.0%
21	30/12/2023	100.00%	100.00%	100.0%
22	06/01/2024	100.00%	100.00%	100.0%

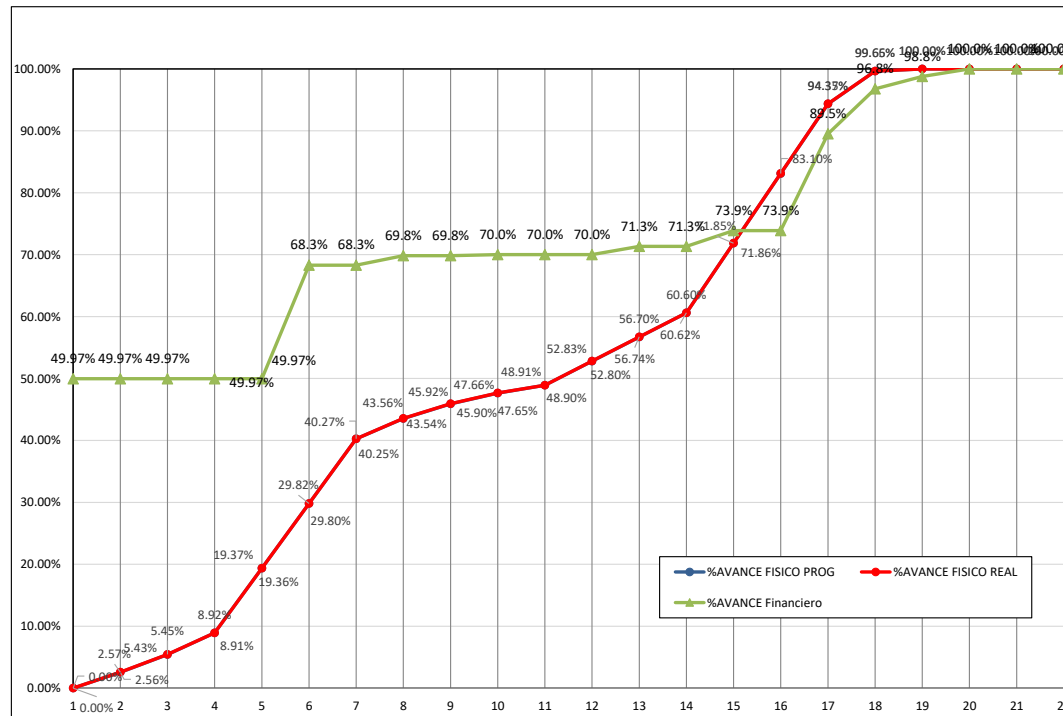

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
