

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 007/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A FINAL DE LA CALLE FAISMUN 016/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE

Ubicación: LA GUAYANA RANCHO SECO

Contrato: FAISMUN 007 016/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: LEOPOLDO MORONES FONSECA

Programa: SD ALCANTARILLADO
SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 4 de septiembre de 2023

Días de Obra: 37

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 4 de septiembre de 2023

Monto Contratado: \$985,000.00


Residente: URB. SERGIO MARQUEZ LEON

Fin Vigente: martes, 10 de octubre de 2023

Monto Ejercido: \$985,000.00

Fin Real: martes, 10 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.26%	0.27%	42.4%
2	11/09/2023	5.28%	5.30%	42.4%
3	18/09/2023	37.22%	37.24%	42.4%
4	25/09/2023	78.78%	78.80%	42.4%
5	02/10/2023	99.65%	99.65%	42.4%
6	10/10/2023	100.00%	100.00%	69.7%
7	17/10/2023	100.00%	100.00%	69.7%
8	24/10/2023	100.00%	100.00%	77.1%
9	31/10/2023	100.00%	100.00%	80.1%
10	07/11/2023	100.00%	100.00%	
11	14/11/2023	100.00%	100.00%	
12	21/11/2023	100.00%	100.00%	
13	01/12/2023	100.00%	100.00%	

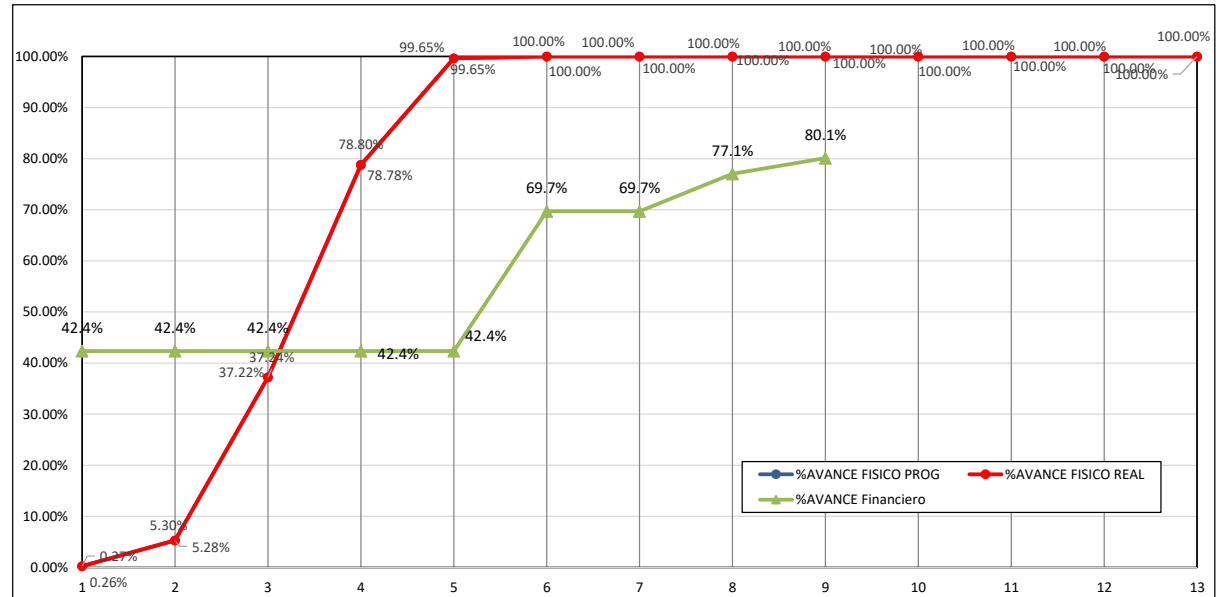

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
