

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 008/2023 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO  
 FAISMUN 013/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO  
 FAISMUN 020/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO

**Ubicación:** COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

**Contrato:** FAISMUN 008 013 020/2023  
**Contratista:** JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

**Programa:** SD ALCANTARILLADO  
 SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 4 de septiembre de 2023

**Días de Obra:** 73

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN

**Inicio Real:** lunes, 4 de septiembre de 2023

**Monto Contratado:** \$2,043,246.15


**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

**Fin Vigente:** miércoles, 15 de noviembre de 2023

**Monto Ejercido:** \$2,043,246.15

**Fin Real:** miércoles, 15 de noviembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/09/2023	0.00%	0.00%	41.3%
2	11/09/2023	2.78%	2.80%	41.3%
3	18/09/2023	22.12%	22.15%	41.3%
4	25/09/2023	42.30%	42.33%	41.3%
5	02/10/2023	61.23%	61.24%	49.6%
6	09/10/2023	73.80%	73.81%	49.6%
7	16/10/2023	81.11%	81.12%	59.5%
8	23/10/2023	92.99%	92.99%	59.5%
9	30/10/2023	93.45%	93.47%	77.2%
10	06/11/2023	95.14%	95.16%	77.2%
11	13/11/2023	99.13%	99.14%	77.2%
12	20/11/2023	100.00%	100.00%	77.2%
13	27/11/2023	100.00%	100.00%	92.7%
14	04/12/2023	100.00%	100.00%	92.7%
15	11/12/2023	100.00%	100.00%	92.7%
16	18/12/2023	100.00%	100.00%	100.0%
17	25/12/2023	100.00%	100.00%	100.0%

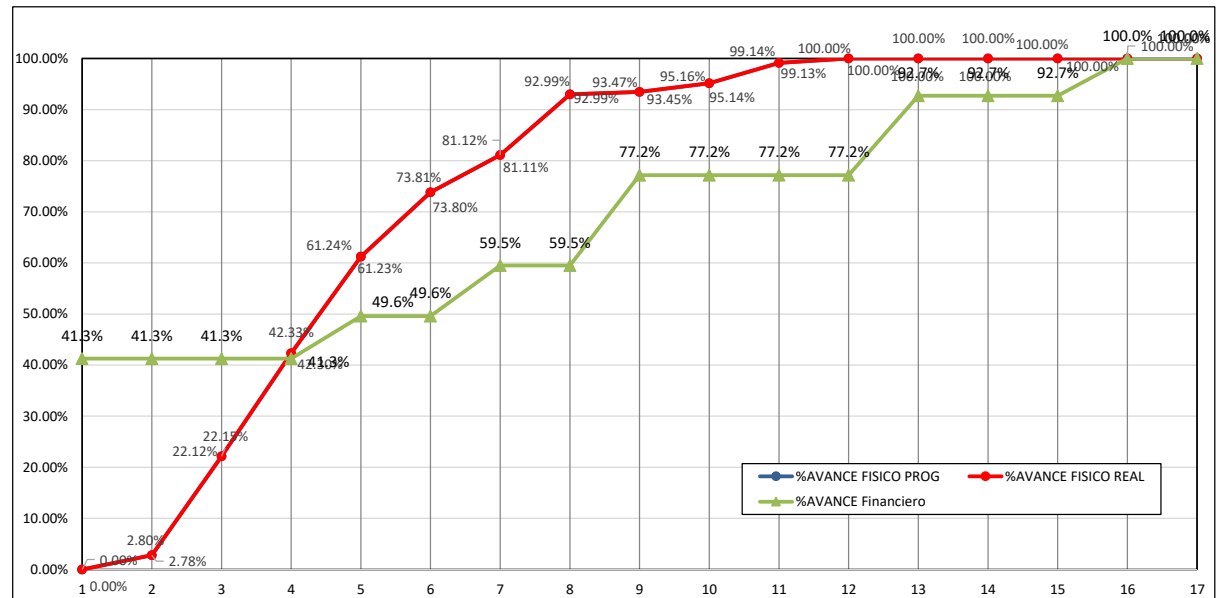

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
