


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 012/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON A AVENIDA BENITO JUÁREZ  
**Ubicación:** COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL **Contrato:** FAISMUN 012 019/2023  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 **Contratista:** DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** viernes, 4 de agosto de 2023 **Días de Obra:** 75  
**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** viernes, 4 de agosto de 2023 **Monto Contratado:** \$4,930,459.24  
**Residente:** URB. SERGIO MARQUEZ LEON **Fin Vigente:** martes, 17 de octubre de 2023 **Monto Ejercido:** \$4,930,459.24  
**Fin Real:** martes, 17 de octubre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/08/2023	0.00%	0.00%	44.78%
2	09/08/2023	3.06%	3.07%	44.78%
3	16/08/2023	6.13%	6.14%	44.78%
4	23/08/2023	9.19%	9.21%	44.78%
5	30/08/2023	12.25%	12.26%	44.78%
6	06/09/2023	18.86%	18.89%	53.72%
7	13/09/2023	37.72%	37.73%	53.72%
8	20/09/2023	56.58%	56.60%	53.72%
9	27/09/2023	75.44%	75.46%	81.43%
10	04/10/2023	83.60%	83.62%	81.43%
11	11/10/2023	91.76%	91.77%	81.43%
12	18/10/2023	100.00%	100.00%	81.43%
13	25/10/2023	100.00%	100.00%	81.43%
14	01/11/2023	100.00%	100.00%	81.43%
15	08/11/2023	100.00%	100.00%	89.6%
16	16/11/2023	100.00%	100.00%	100.0%

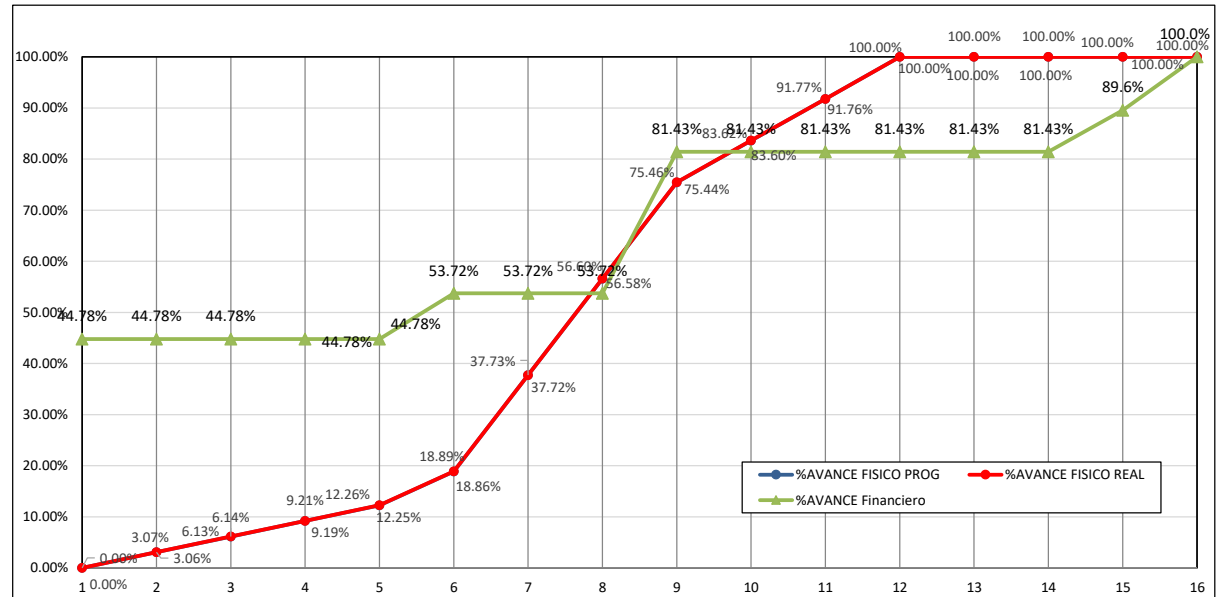

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
