

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 018/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A PRIMERO DE MAYO

Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FAISMUN 018/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: EDIFICACIONES PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.

Programa: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: martes, 5 de septiembre de 2023

Días de Obra: 30

Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: martes, 5 de septiembre de 2023

Monto Contratado: \$1,749,089.34

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA


Fin Vigente: miércoles, 4 de octubre de 2023

Monto Ejercido: \$1,693,625.46

Fin Real: miércoles, 4 de octubre de 2023

SE SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/09/2023	0.00%	0.00%	50.0%
2	15/09/2023	14.80%	14.82%	50.0%
3	30/09/2023	96.56%	96.57%	50.0%
4	15/10/2023	100.00%	100.00%	96.7%
5	30/10/2023	100.00%	100.00%	96.8%
6	15/11/2023	100.00%	100.00%	96.8%

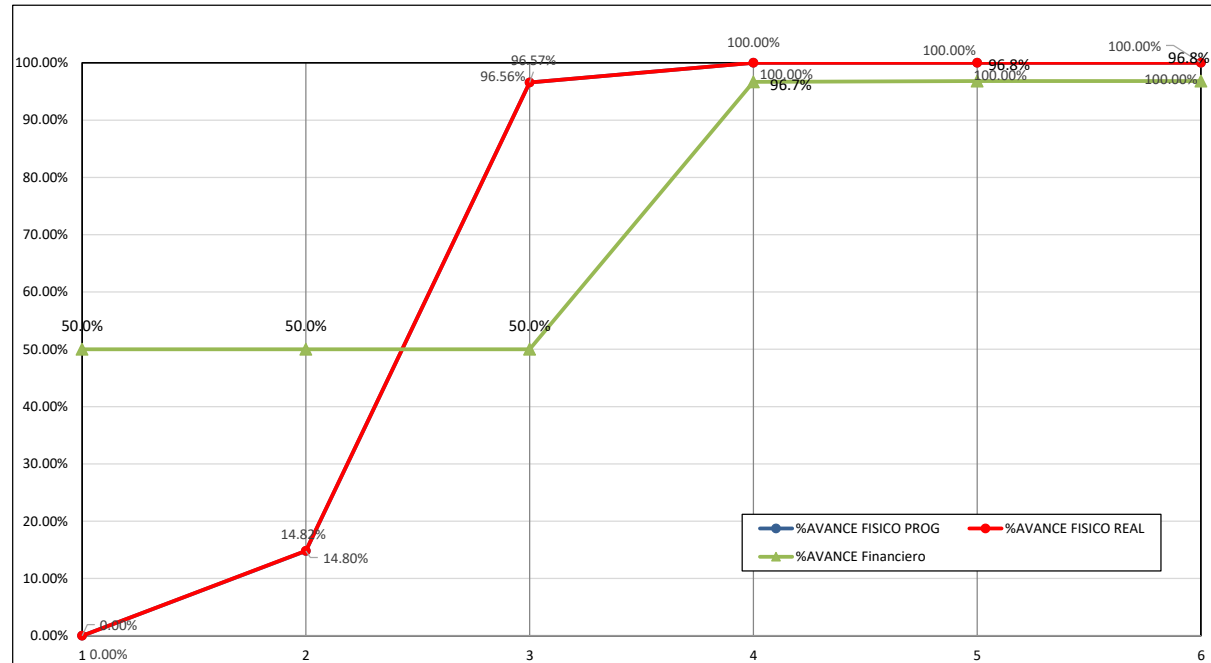

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
