

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 025/2023 AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCION MEXICANA SUR DE CALLE GUAYANA A FIN DE CALLE FAISMUN 026/2023 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL MONTE DE CALLE FRANCISCO PONCE A EMILIANO ZAPATA

Ubicación: MACARIO J. GOMEZ

Contrato: FAISMUN 025 026/2023

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Contratista: HUGO EDER SANTOS GONZALEZ

Programa: SG ELECTRIFICACION

Inicio Vigente: viernes, 27 de octubre de 2023

Días de Obra: 45

Subprograma: 02 RURAL, AMPLIACION

Inicio Real: viernes, 27 de octubre de 2023

Monto Contratado: \$944,681.82

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES


Fin Vigente: lunes, 11 de diciembre de 2023

Monto Ejercido: \$912,859.49

Fin Real: lunes, 11 de diciembre de 2023

SE SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	27/10/2023	1.33%	1.34%	50.0%
2	03/11/2023	21.12%	21.14%	50.0%
3	10/11/2023	38.26%	38.26%	50.0%
4	17/11/2023	45.02%	45.04%	50.0%
5	24/11/2023	50.60%	50.63%	62.7%
6	01/12/2023	68.45%	68.45%	62.7%
7	08/12/2023	98.77%	98.79%	62.7%
8	15/12/2023	100.00%	100.00%	82.3%
9	22/12/2023	100.00%	100.00%	95.4%
10	29/12/2023	100.00%	100.00%	
11	05/01/2024	100.00%	100.00%	

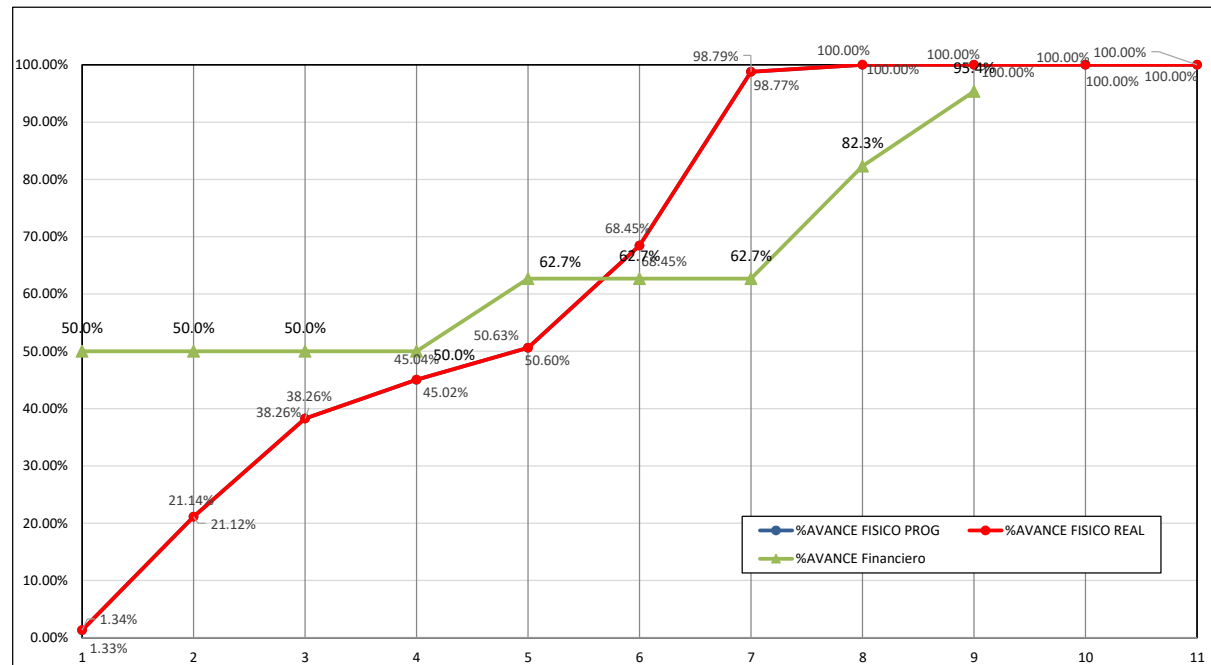

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
